

# GRÈVIA®

DESARROLLOS  
SUSTENTABLES

Avance de obra

Nro 16

**Abril 2026**

## GBXIV

# Virrey del Pino

## 2268

Proyecta:

2  
PS

PARYSOW +  
SCHARGRODSKY  
ARQUITECTOS


Dirección de obra:



Molinaro | Fenoglio  
arquitectos



AVANCE  
DE OBRA

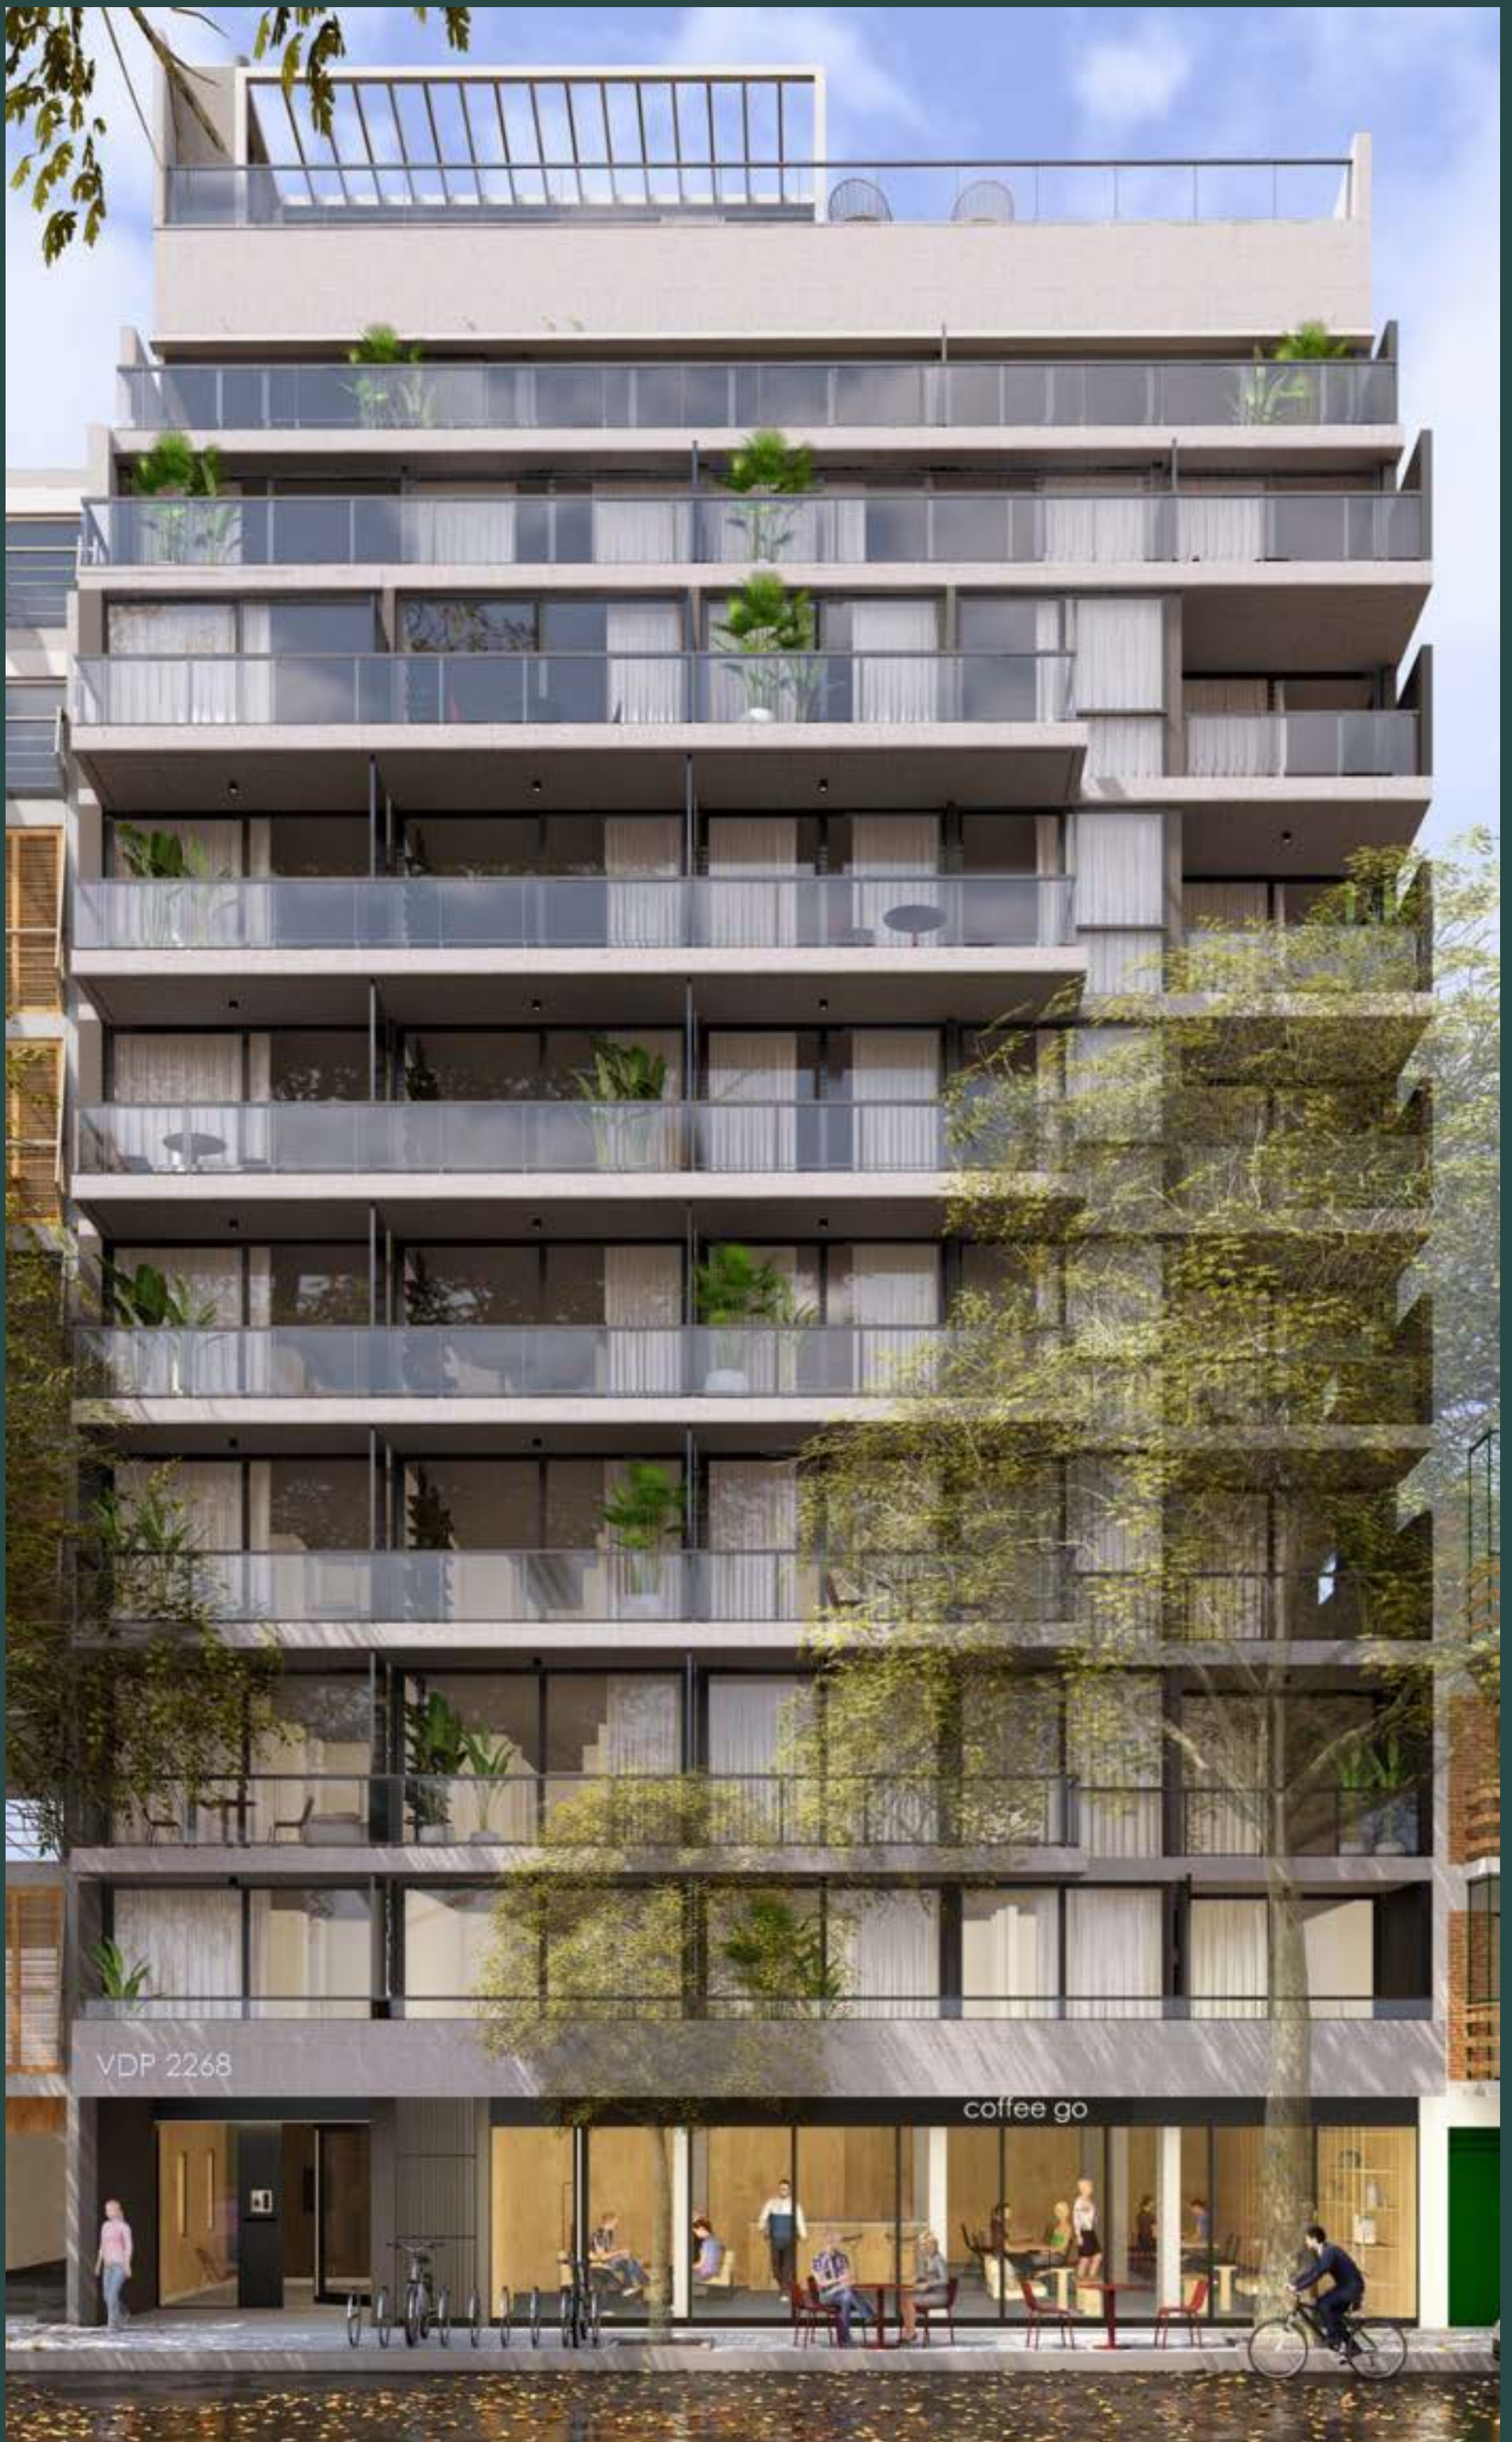



# HORMIGÓN

## losa s/9° piso



04/26

En el mes de abril se realizó el llenado de la losa s/9no, en donde se ubica la piscina, con hormigón utilizando bomba pluma.

**AVANCE DE OBRA**



# ENCOFRADO losa s/10° piso



04/26

Finalizada la losa sobre 9no piso, se iniciaron las tareas de encofrado y armadura de la losa sobre 10mo piso, completando así la última losa del edificio.

**AVANCE DE OBRA**



# ARMADURA

losa s/10° piso



04/26

AVANCE DE OBRA



# ELECTRICIDAD

## losa s/10° piso



04/26

**AVANCE DE OBRA**



# HORMIGÓN

## losa s/10° piso



04/26

A finales de abril se completó el hormigonado de la losa sobre 10mo piso mediante bomba pluma, finalizando así la estructura de hormigón armado del edificio.

**AVANCE DE OBRA**



## AVANCE DE OBRA



## En este proyecto participan:

Proyecta:



PARYSOW +  
SCHARGRODSKY  
ARQUITECTOS

Dirección de obra:



Molinaro | Fenoglio  
arquitectos

Comercializa:

**interwin**  
**5275-4200**

Oficinas

Cerrito 348 3° B,  
Ciudad de Buenos Aires,  
C1010AAH Argentina

E-mail

[info@grevia.com.ar](mailto:info@grevia.com.ar)

Teléfono

54 11 4804 4049

