

Avance de obra
Nro 36
Mayo 2026


GBX
Costa Rica
5448

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:



Molinaro | Fenoglio
arquitectos



AVANCE
DE OBRA



HERRERÍA planta baja




05/26

Se realizó la colocación del portón de acceso al estacionamiento del subsuelo. También se continuaron con las tareas de herrería en el hall del edificio en doble altura.

AVANCE DE OBRA



ASCENSOR

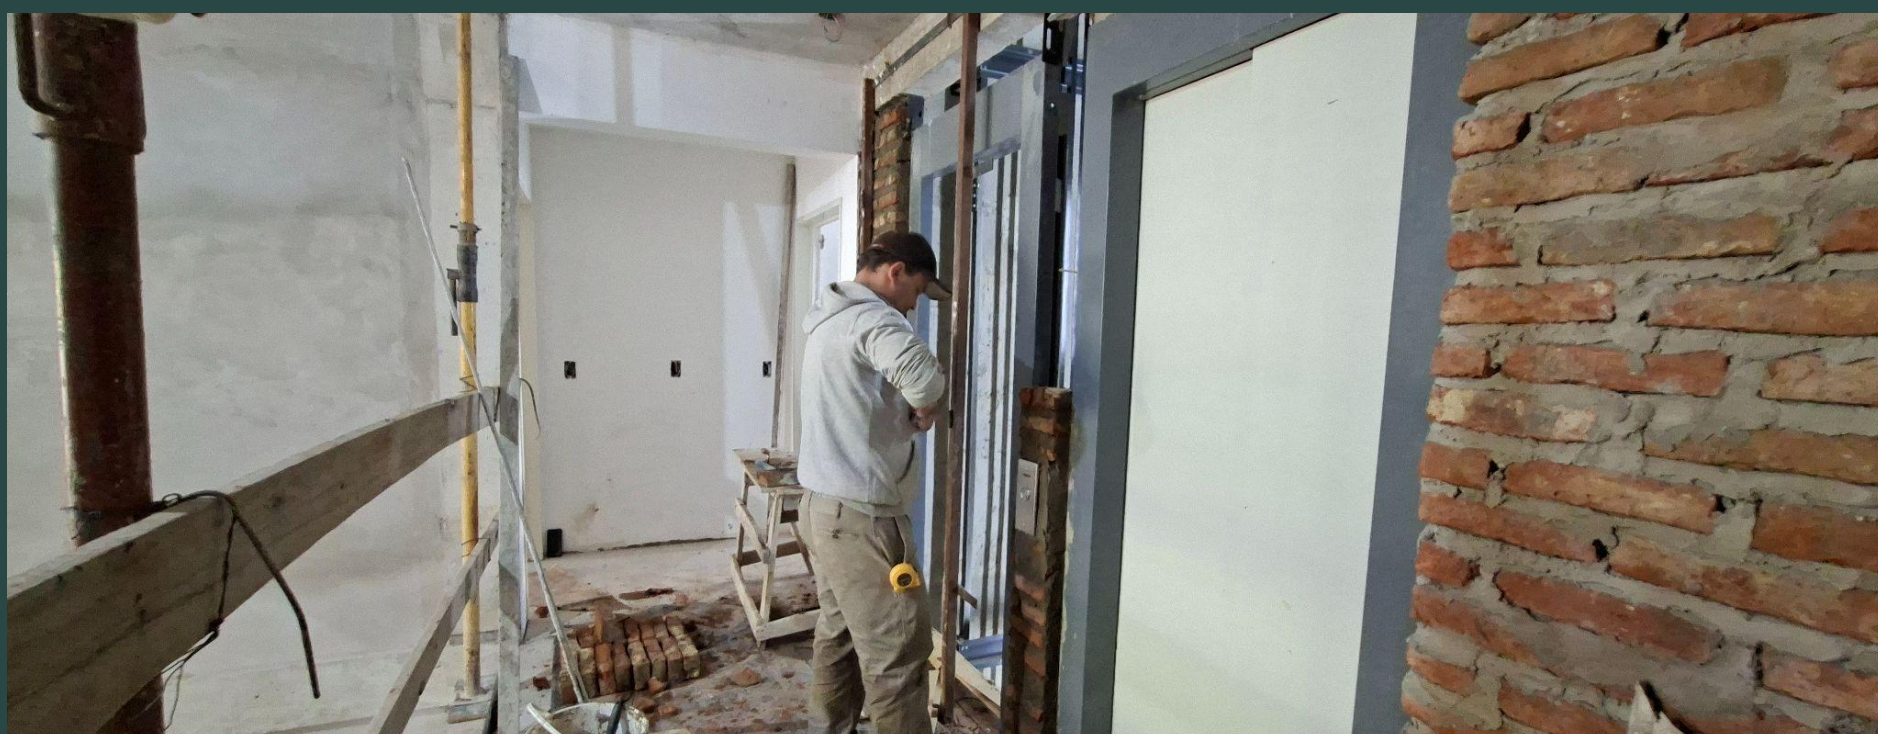

05/26

Se terminó el montaje de la estructura de sostén del ascensor n°2 y la colocación de la cabina.

AVANCE DE OBRA



CIELORRASO SUSPENDIDO



05/26

Se realizó la colocación del cielorraso suspendido en el hall de planta baja del edificio, SUM, y en la rampa de acceso al estacionamiento en el subsuelo.

AVANCE DE OBRA




ALBAÑILERÍA GENERAL




05/26

Una vez terminado el montaje del ascensor n°2, se realizó el cierre de hueco de ascensor por piso, yesería y cielorraso en palieres.

AVANCE DE OBRA



CARPINTERÍAS de ALUMINIO

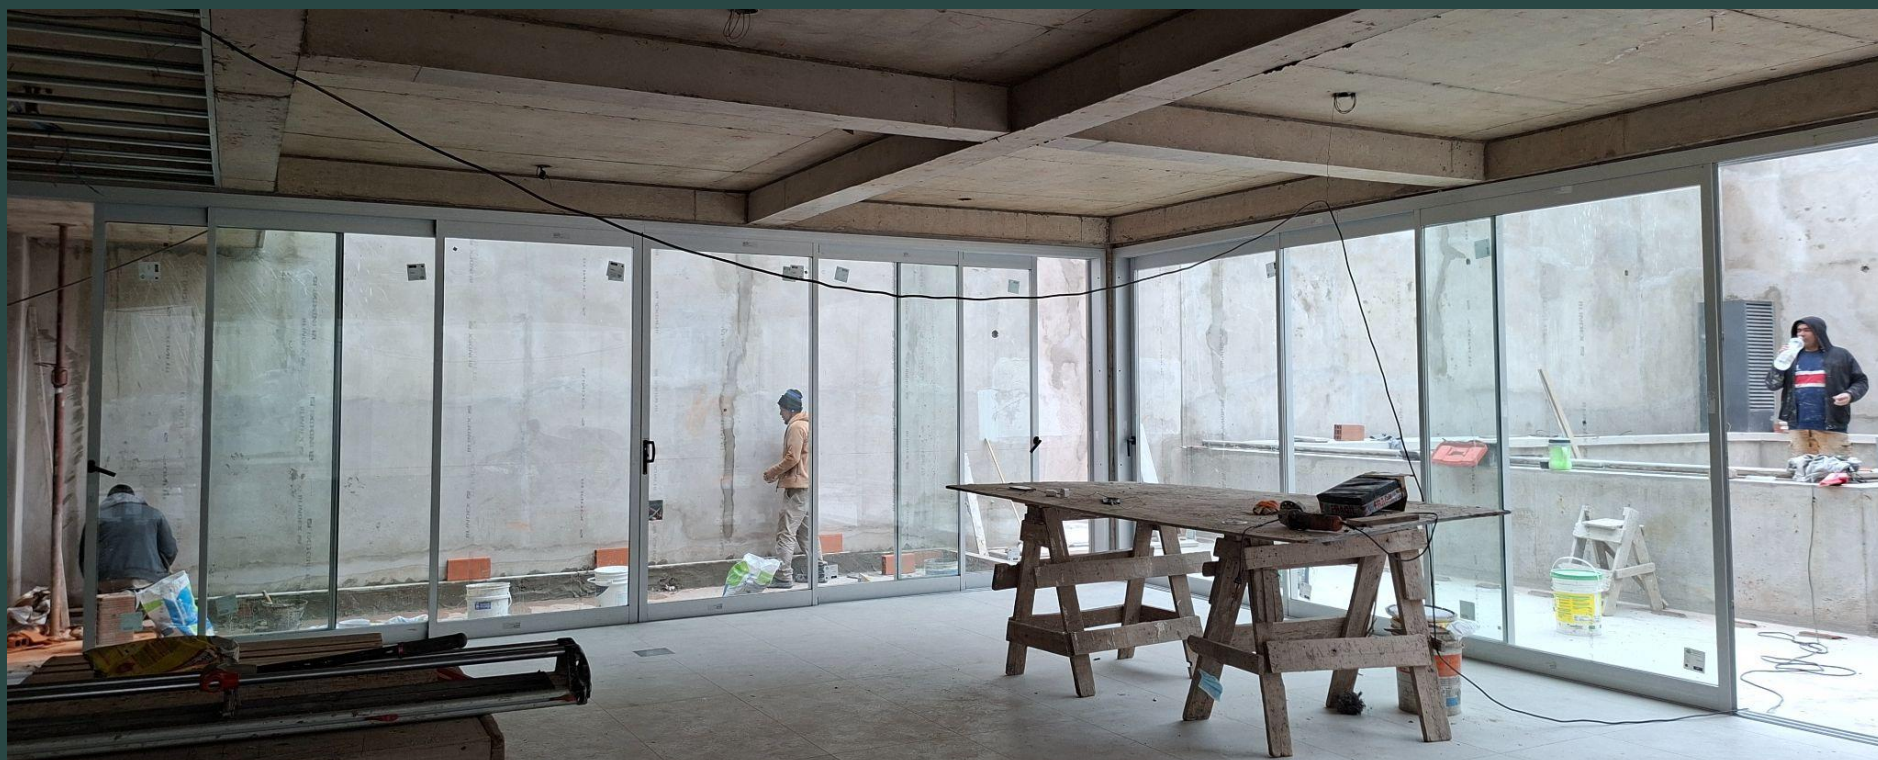


05/26

Se colocó las carpinterías de aluminio en los espacios comunes de la planta baja, como el SUM y gimnasio.

AVANCE DE OBRA



PISCINA

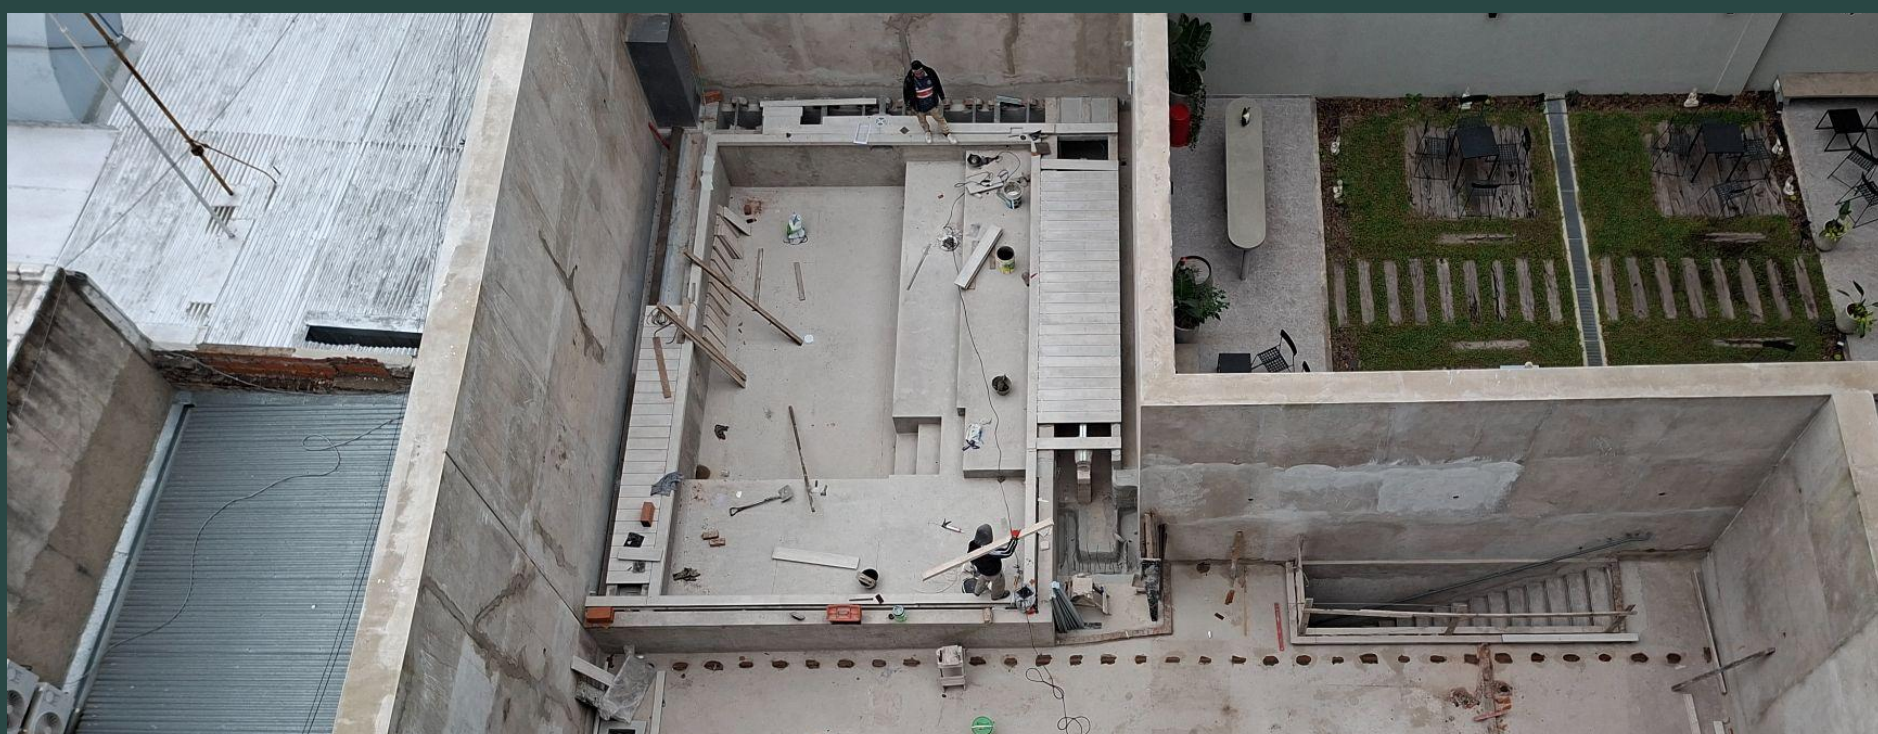

05/26

Luego de la impermeabilización en el sector de la piscina, se hizo la carpeta y revoques para la colocación del revestimiento de venecita.

AVANCE DE OBRA



ELECTRICIDAD



05/26

Se terminó con la colocación de tableros eléctricos en las unidades funcionales y se continuó con los trabajos en salas de tableros de electricidad.

AVANCE DE OBRA



PINTURA



05/26

AVANCE DE OBRA



CARPINTERÍAS de ALUMINIO



05/26

AVANCE DE OBRA



MESADAS cocinas



05/26

AVANCE DE OBRA



AVANCE DE OBRA




En este proyecto participan:

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:



Molinaro | Fenoglio
arquitectos

Comercializa:

GRINBERG

P R O P I E D A D E S

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail

info@grevia.com.ar

Teléfono

54 11 4804 4049

