

Avance de obra
Nro 16
Mayo 2026


GBXII Mendoza 1770

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:



Molinaro | Fenoglio
arquitectos




**AVANCE
DE OBRA**





ENCOFRADO


losa s/11° piso

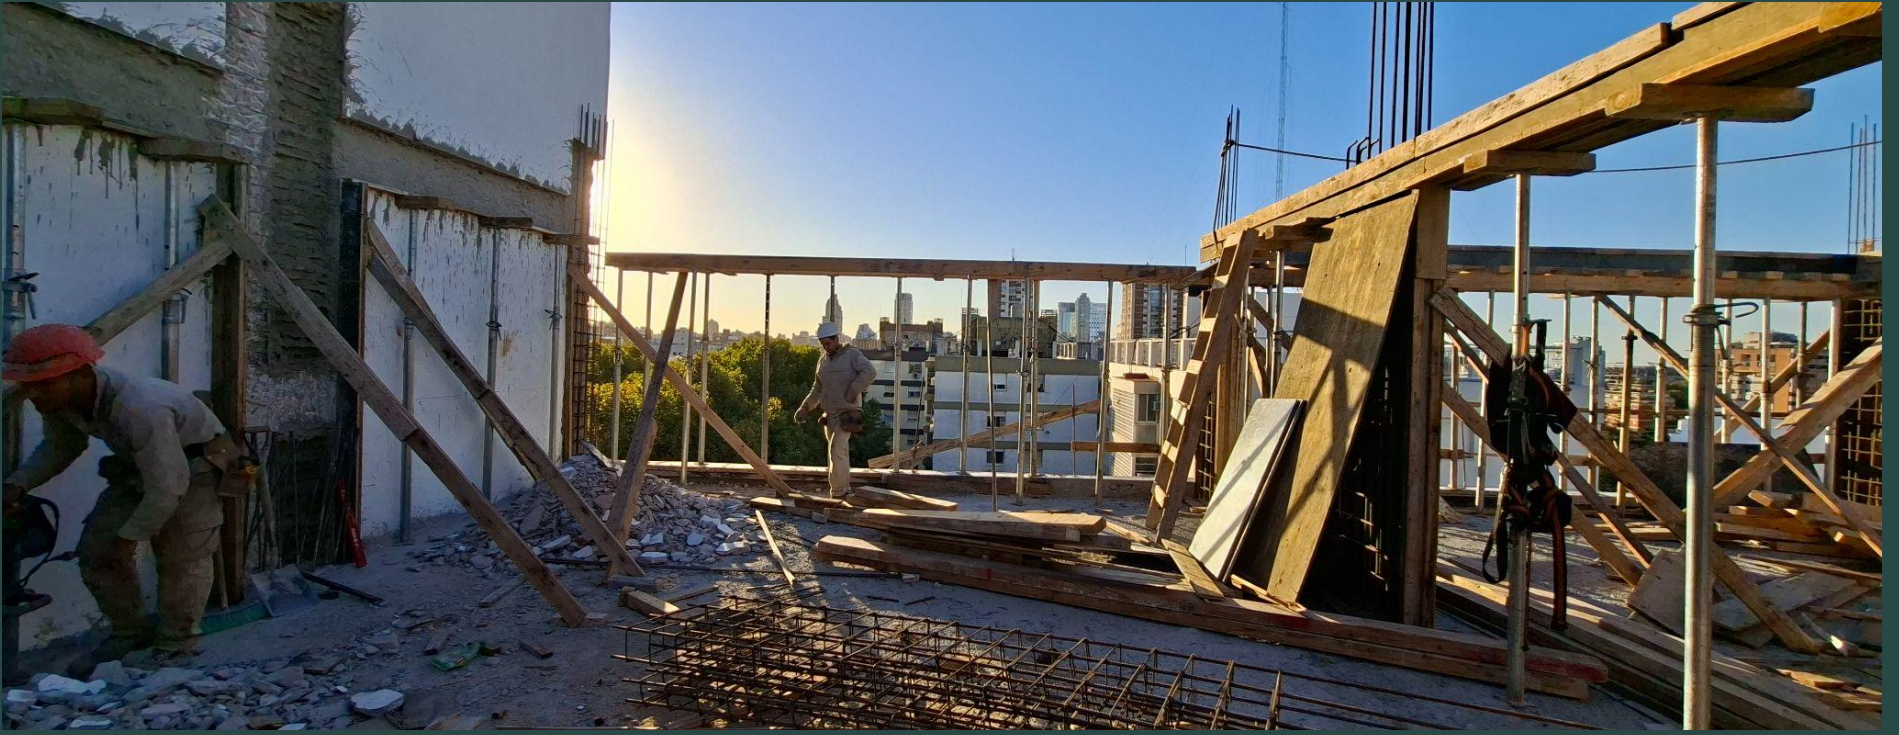

05/26

Durante el mes de mayo se realizó el encofrado de la losa sobre piso 11.

AVANCE DE OBRA



DOBLADO de HIERRO


losa s/11° piso



05/26


En obra se realiza el corte, doblado de hierros y armado de columnas, vigas y losas del edificio.

AVANCE DE OBRA




ARMADURA

losa s/11° piso

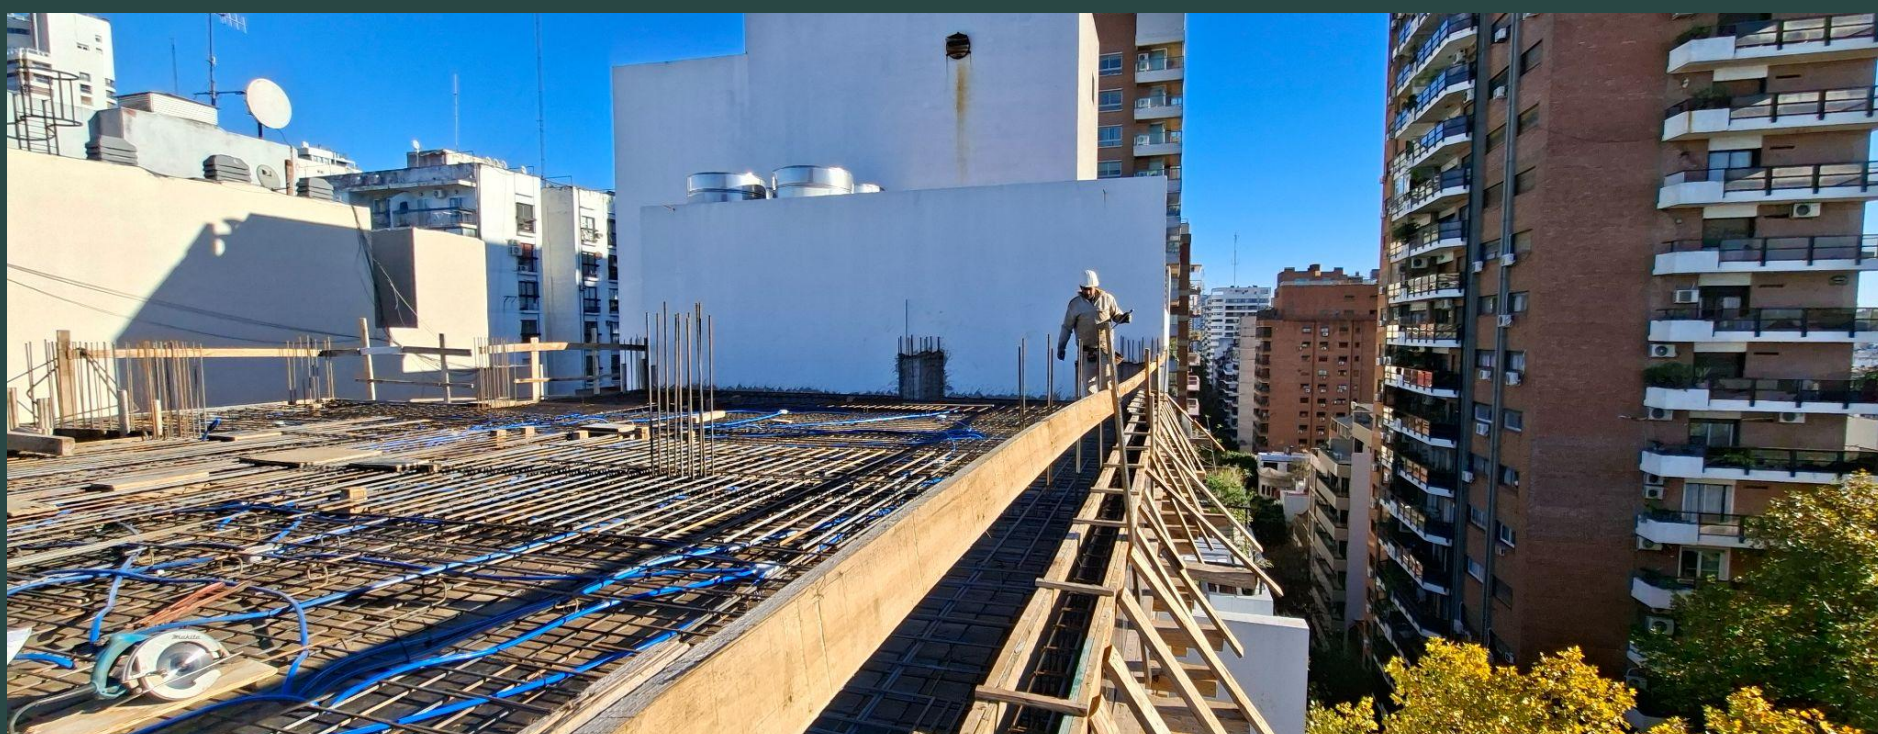


05/26

AVANCE DE OBRA



HORMIGÓN

losa s/11° piso

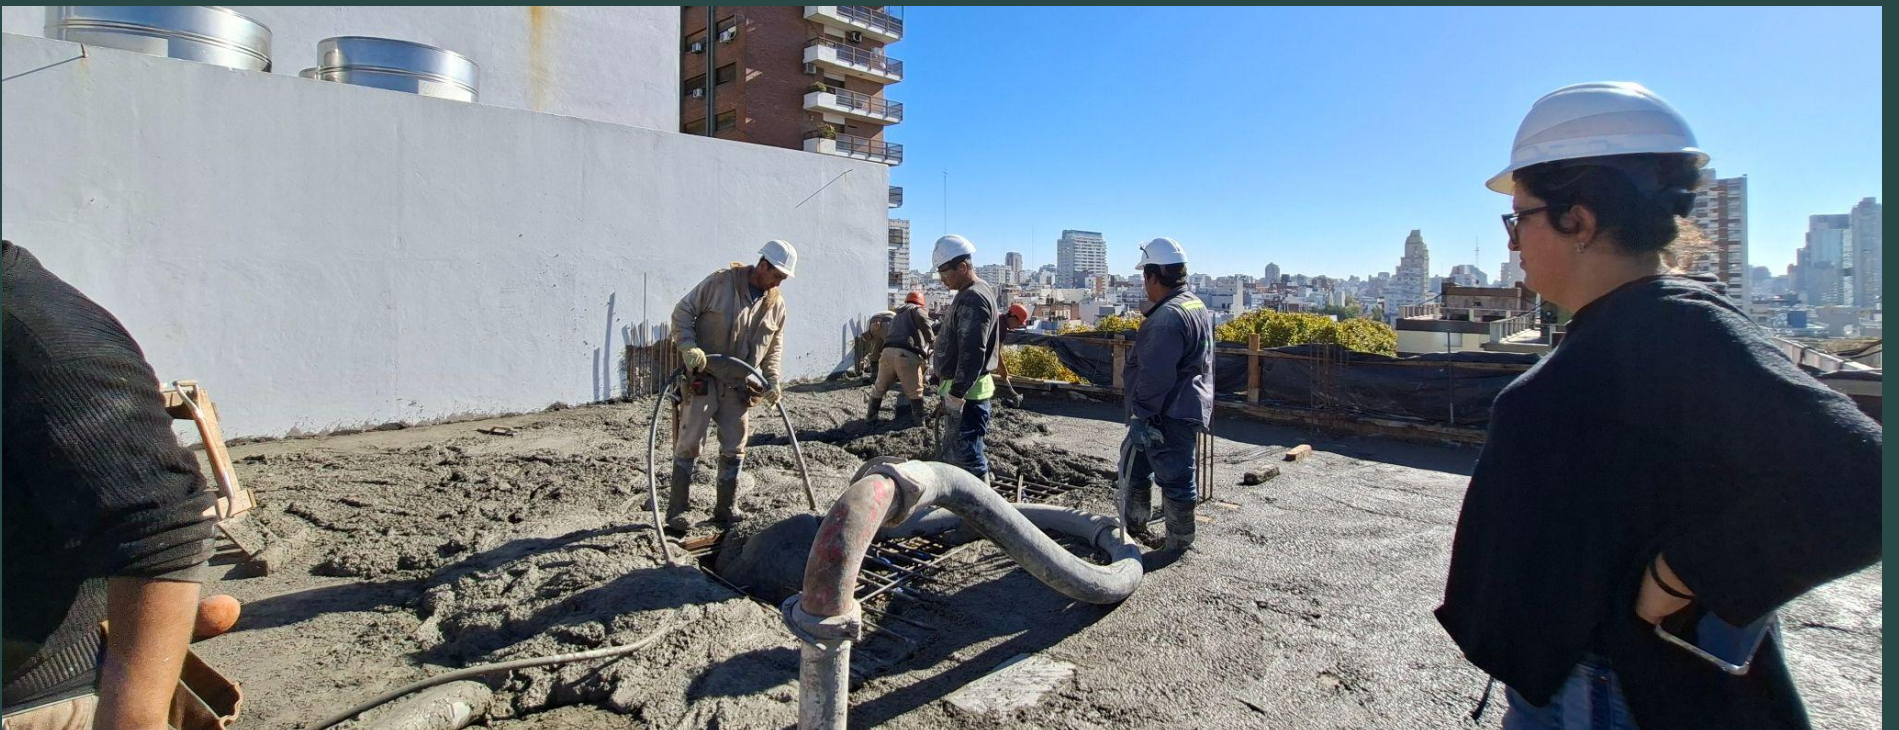

05/26


Se realizó el llenado de la losa sobre piso 11 con hormigón utilizando bomba pluma.

AVANCE DE OBRA



ENCOFRADO

losa s/12° piso

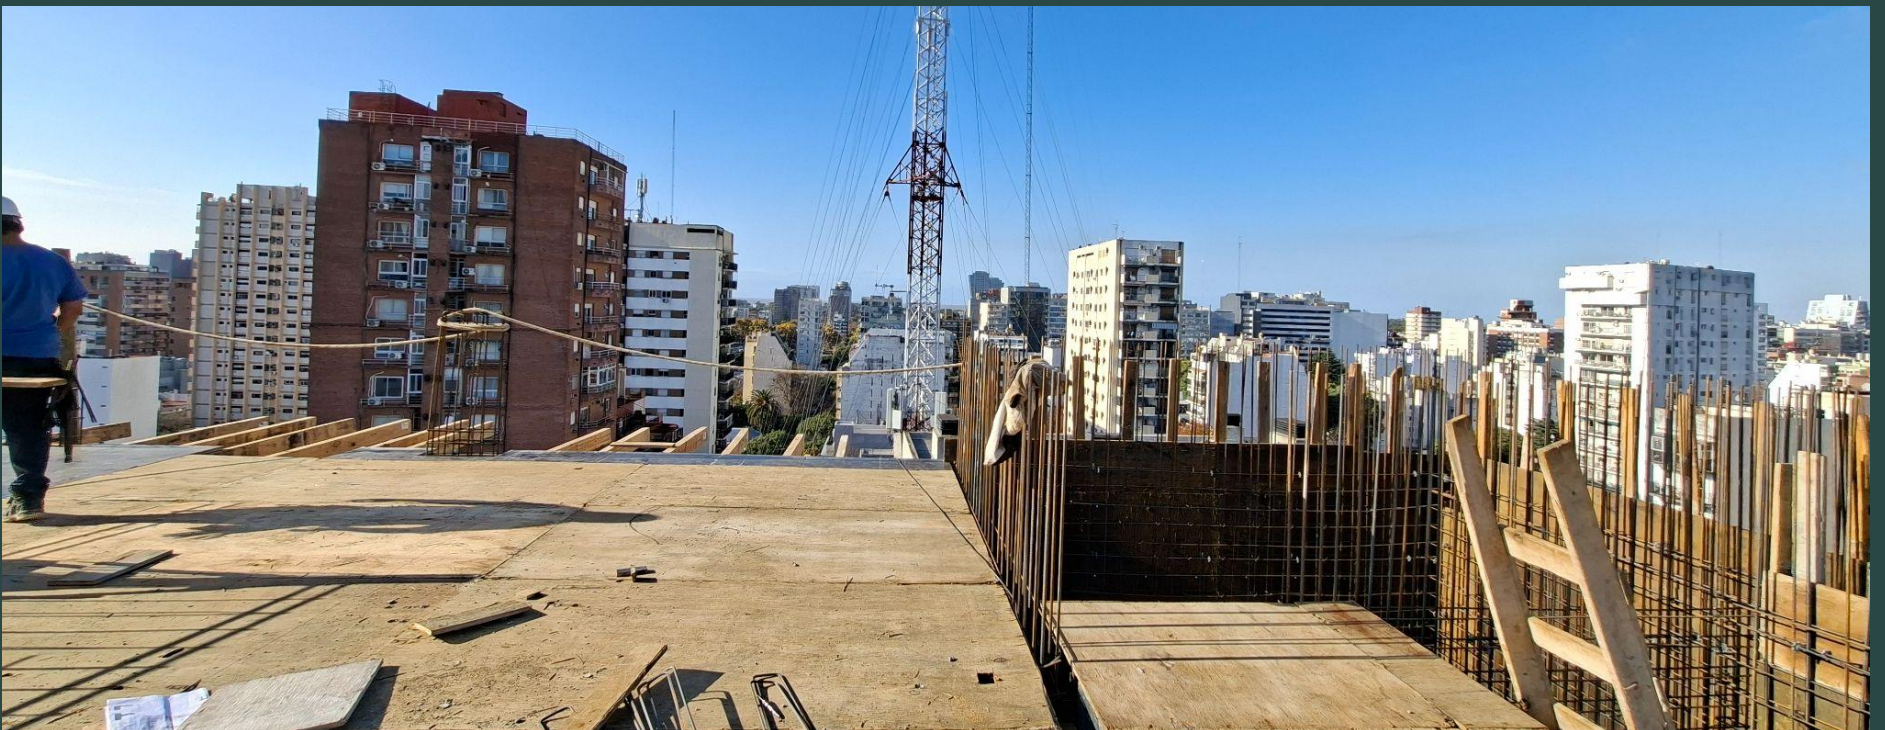

05/26

Finalizando el mes de mayo de comenzó con el armado de encofrado de la losa sobre piso 12.
En esta losa se va a encontrar la piscina y terraza del edificio.

AVANCE DE OBRA



**AVANCE
DE OBRA**




En este proyecto participan:

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:



Molinaro | Fenoglio
arquitectos

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail

info@grevia.com.ar

Teléfono

54 11 4804 4049

