

Avance de obra
Nro 33
Junio 2026

GBXI
Pacheco de Melo
2592

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura



AVANCE
DE OBRA





FACHADA Albañilería



Este mes se finalizó la colocación de ladrillo visto sobre la fachada del edificio. La semana entrante se comienza con el ladrillo visto del contrafrente

AVANCE DE OBRA



MESADAS

Mesadas en baño y toilette




Durante este mes se comenzó la colocación de mesadas de Purastone en baños y toilettes. A su vez el revestimiento de baños con porcelanato avanzó hasta el piso 5 inclusive.

AVANCE DE OBRA



HERRERÍA

Barandas de balcones

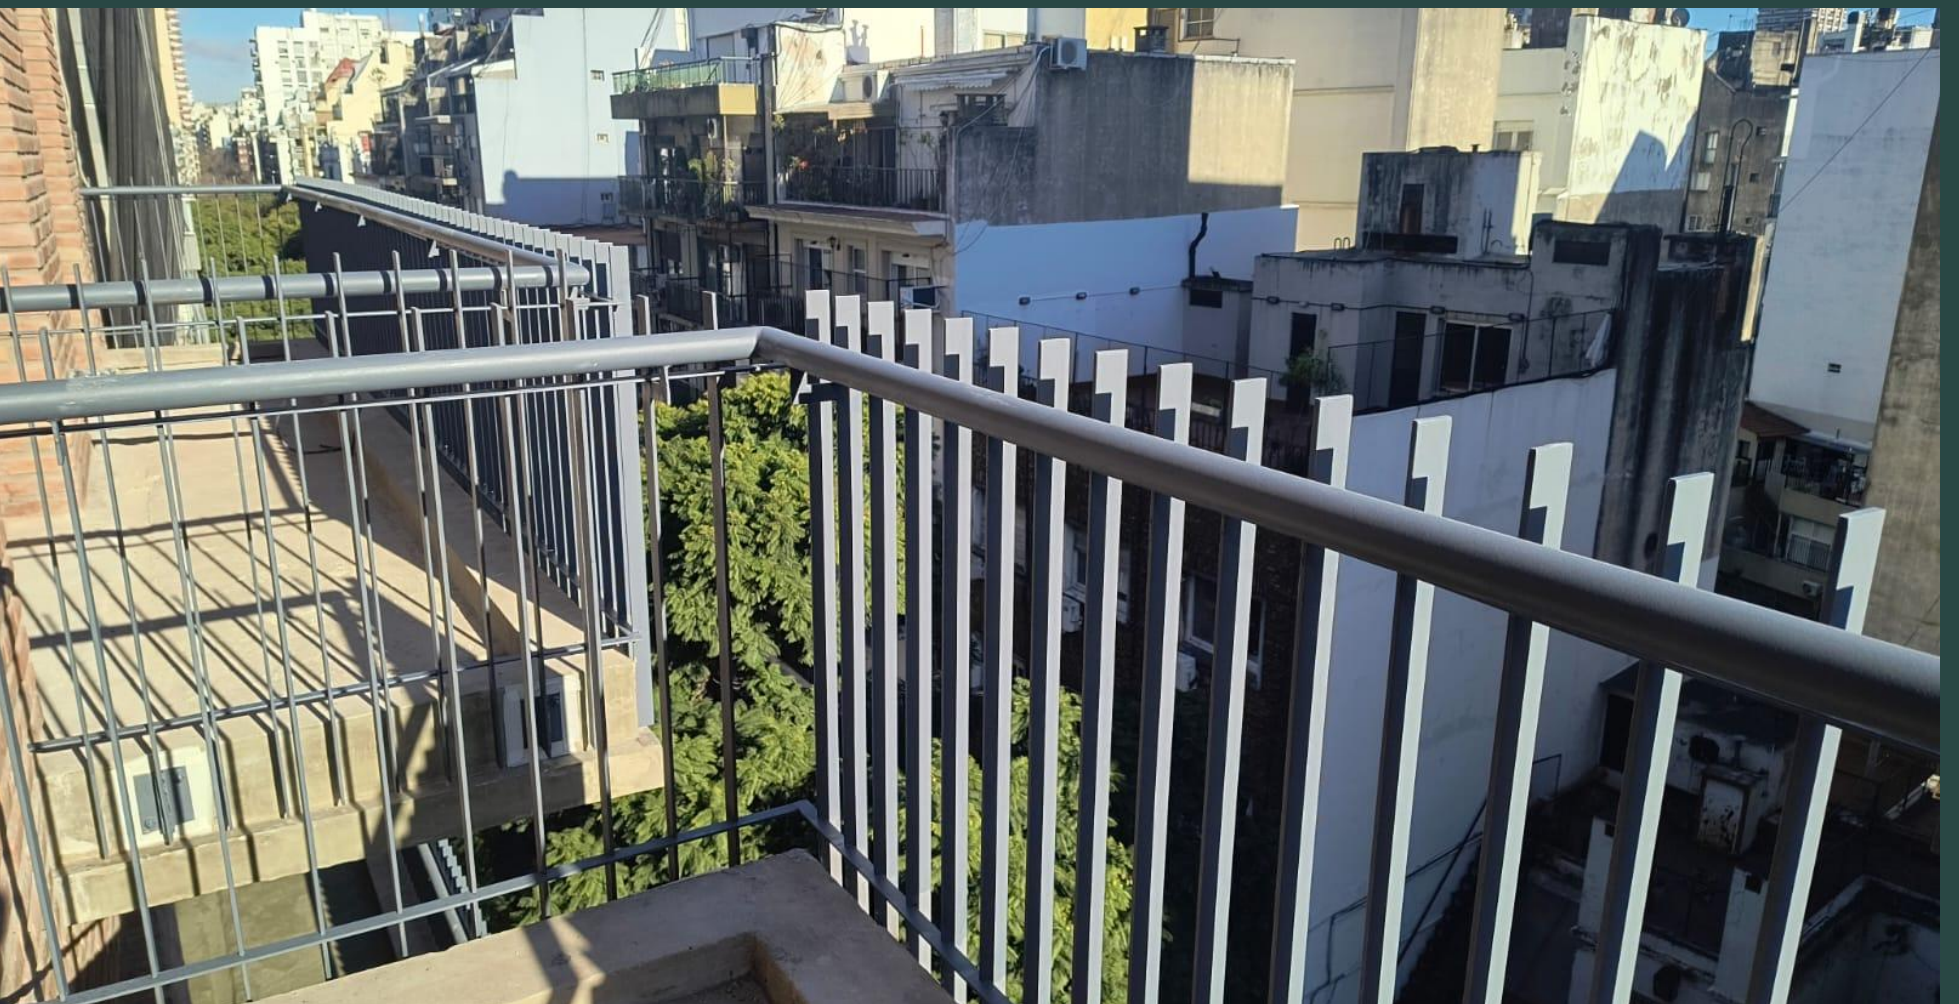


Este mes se finalizó la colocación de barandas metálicas en balcones. En este momento se encuentra en ejecución las barandas en azotea.

AVANCE DE OBRA



PINTURA

Unidades funcionales

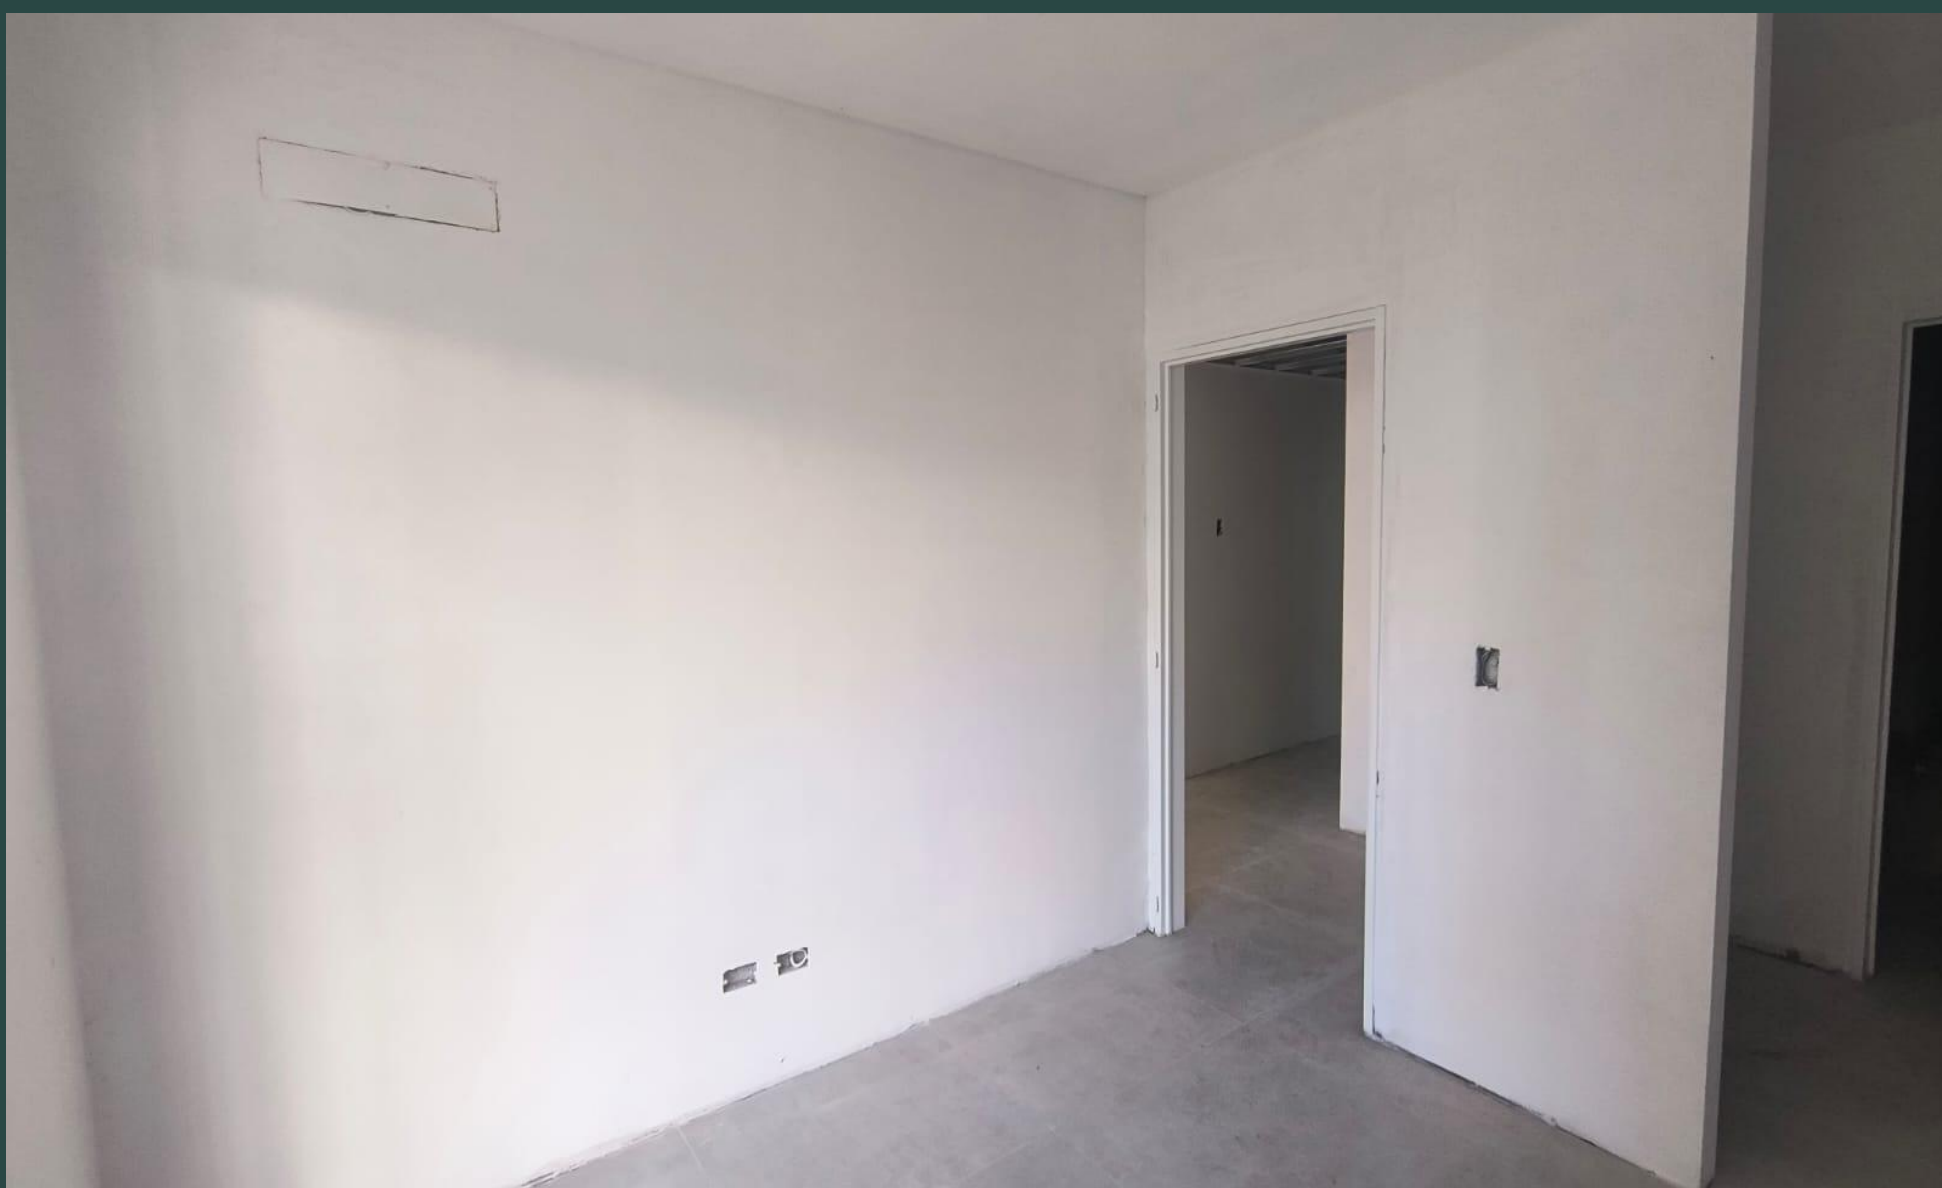

Durante el transcurso del mes se comenzó con la primer mano de pintura de las unidades hasta el piso 4 en su totalidad. A su vez los marcos de puertas se encuentran terminados hasta piso 8.

AVANCE DE OBRA



PLOMERÍA

Instalación Sanitaria



Durante todo el mes tuvimos avances en las instalaciones sanitarias. Se continuó con el montaje de cañerías cloacales y desagües pluviales de los pisos superiores. Alcanzando el nivel de azotea y comenzando con los desagües pluviales en PB.

AVANCE DE OBRA



Así se ve la fachada y
pisos en altura hoy.



En este proyecto participan:

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura

Comercializa:

interwin
5275-4200

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail

info@grevia.com.ar

Teléfono

54 11 4804 4049

