

Avance de obra
Nro 1
Junio 2026

GBXVI
Guatemala
4487

Proyecta:

ABRAMZON

ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura



**AVANCE
DE OBRA**





AVANCE DE OBRA

Excavación



Se comenzó con la excavación en el centro del terreno a -1.50m dejando el talud perimetral.

AVANCE DE OBRA



AVANCE DE OBRA

Excavación y anclajes




Se realizó la apertura de troneras N°1 de todo el primer anillo de submuración, y la perforación y colado de anclajes

AVANCE DE OBRA



AVANCE DE OBRA

Armado y gunitado

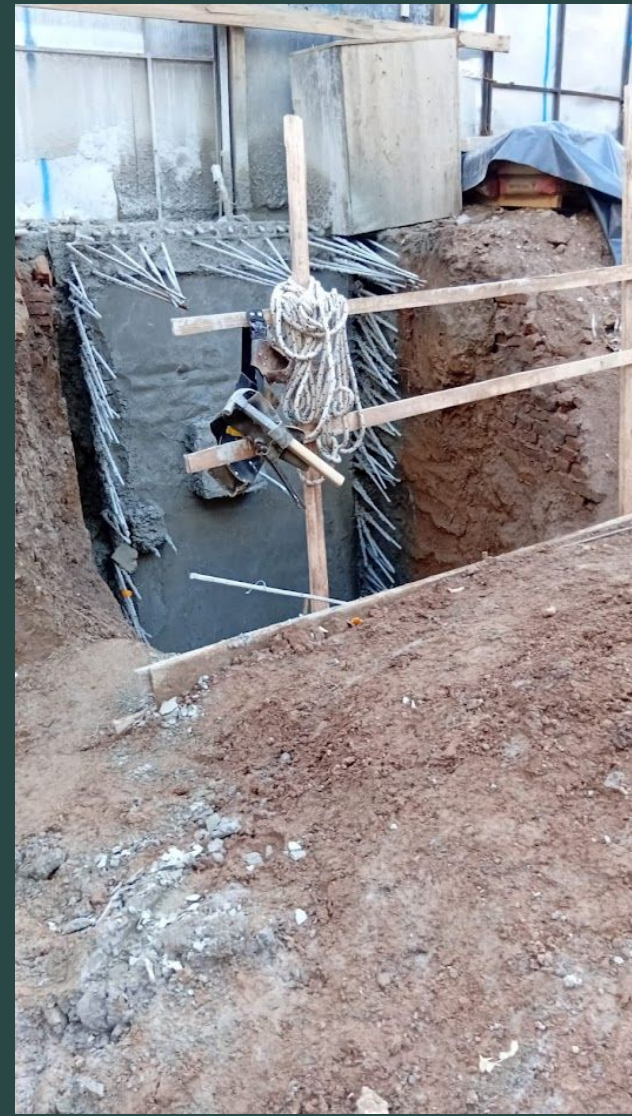

El 18 de junio se realizó el gunitado de tabiques de esta etapa

AVANCE DE OBRA



AVANCE DE OBRA

Excavación y anclajes



Se realizó la apertura de troneras N°2 y ejecución de anclajes

AVANCE DE OBRA



AVANCE DE OBRA

Armado y gunitado



El día 01/07 se realizó el gunitado de la secuencia N°2 del primer anillo submural

AVANCE DE OBRA

En este proyecto participan:

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura

Comercializa:

interwin
5275-4200

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail

info@grevia.com.ar

Teléfono

54 11 4804 4049

