

Avance de obra
Nro 18
Julio 2026


GBXII Mendoza 1770

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:



Molinaro | Fenoglio
arquitectos




AVANCE
DE OBRA





ENCOFRADO


losa s/azotea

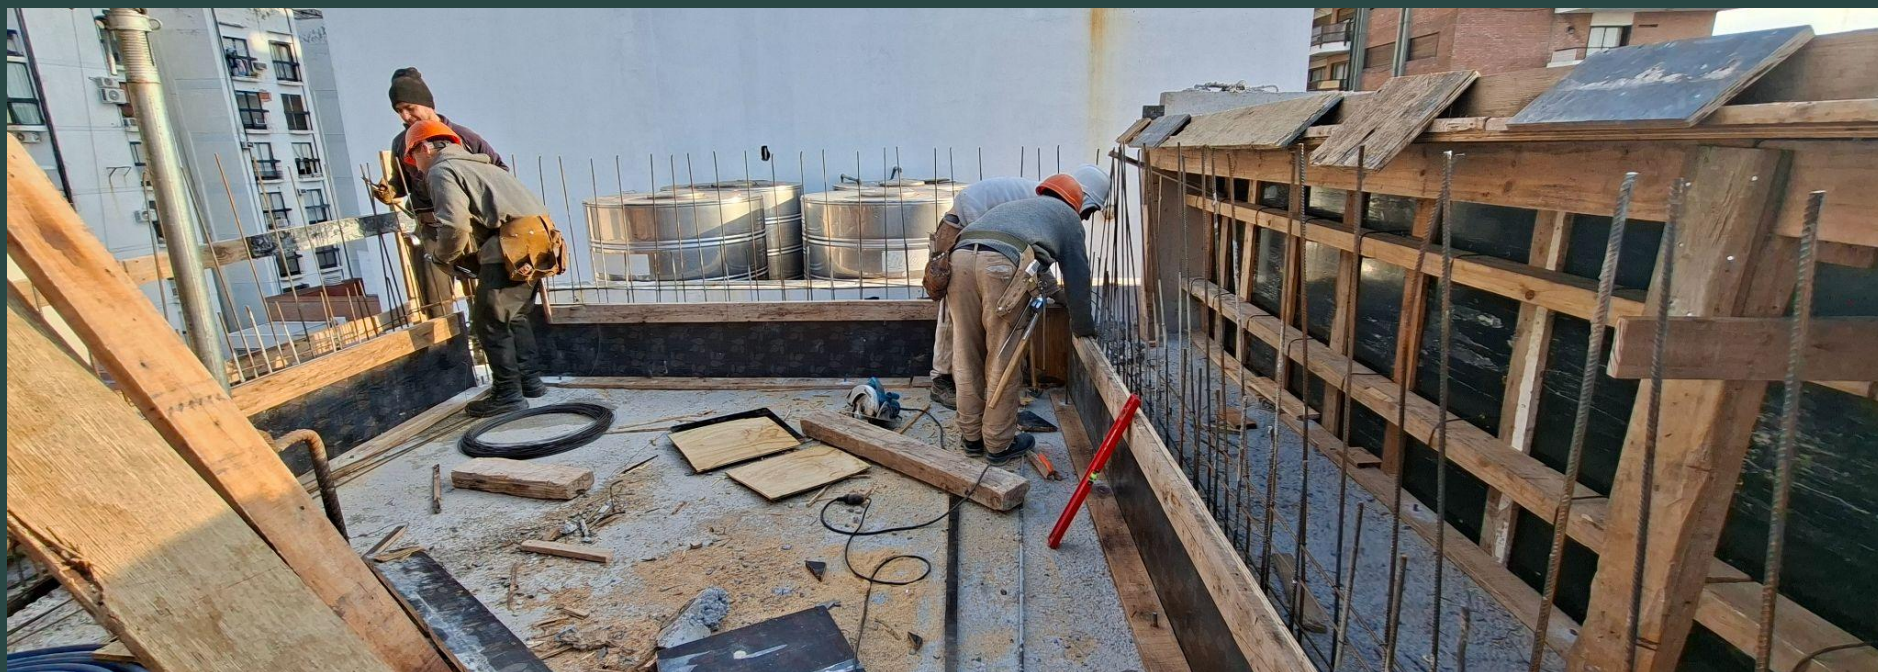

07/26


Se finalizó con la 2da etapa del encofrado de la losa sobre piso 12, en donde se va a encontrar la piscina y terraza del edificio.

AVANCE DE OBRA



HORMIGÓN

losa s/azotea

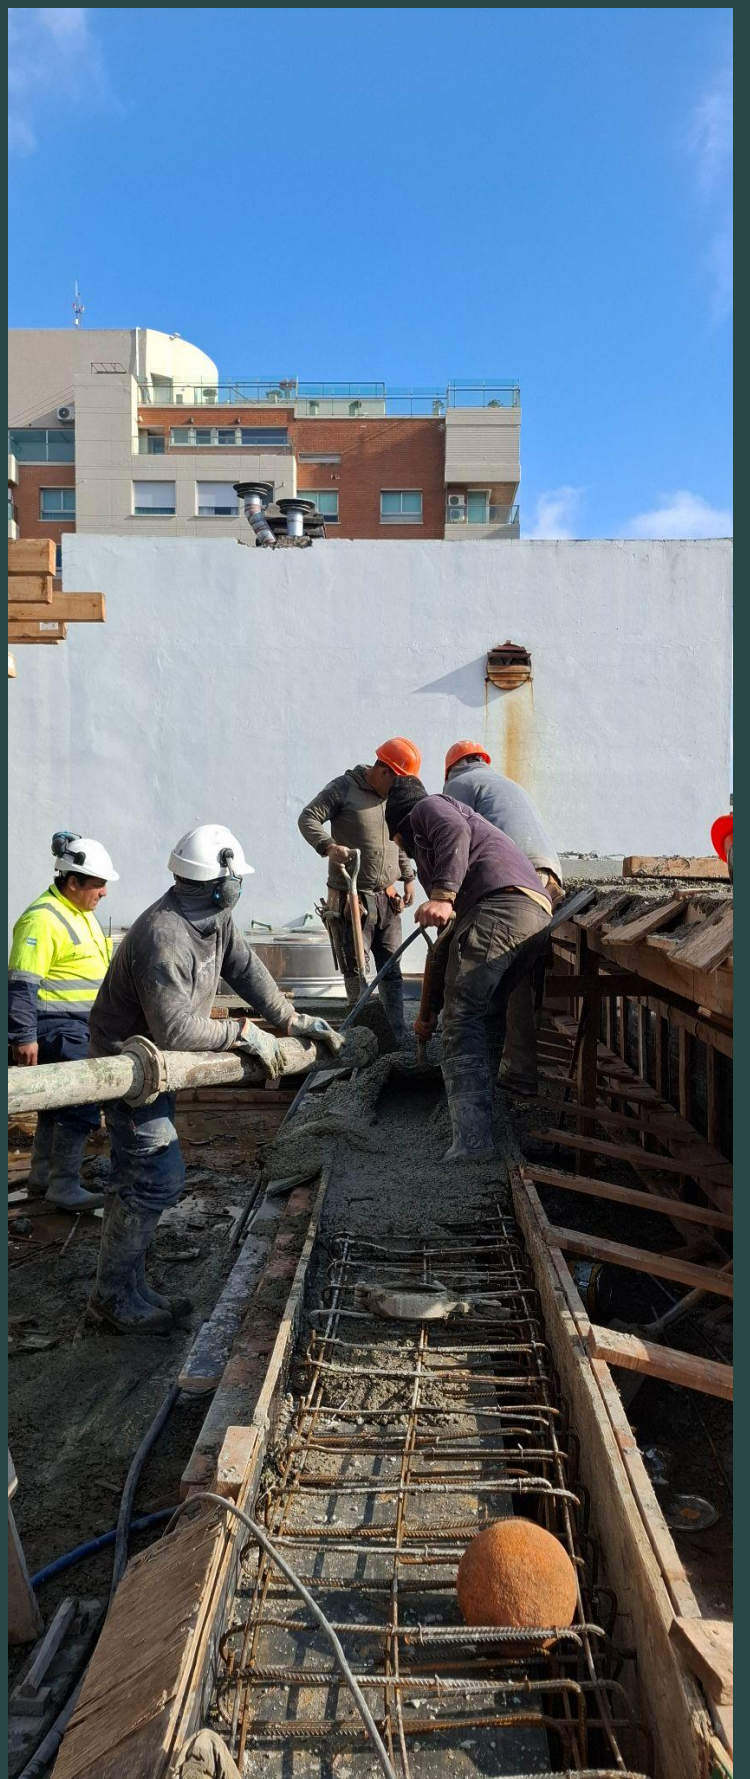

07/26

Durante el mes de julio se realizó el hormigonado de la losa sobre azotea y 2da etapa de losa sobre piso 12 mediante bomba pluma, finalizando así la estructura de hormigón armado del edificio.

AVANCE DE OBRA



LIMPIEZA



07/26

Se realizó el desencofrado de la última losa del edificio y desapuntalamiento. También se está haciendo una limpieza general del edificio, y tareas preliminares para comenzar con replanteo de mampostería.

AVANCE DE OBRA



**AVANCE
DE OBRA**




En este proyecto participan:

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:



Molinaro | Fenoglio
arquitectos

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail

info@grevia.com.ar

Teléfono

54 11 4804 4049

