

Avance de obra
Nro 2
Julio 2026

GBXVI
Guatemala
4487

Proyecta:

ABRAMZON

ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura



**AVANCE
DE OBRA**





AVANCE DE OBRA

Excavación y armado



Se realizó la excavación de la secuencia N°3 de tabiques submurales, perforación y llenado de anclajes, armado y gunitado de tabiques



AVANCE DE OBRA

Hormigón




Secuencia N°3

AVANCE DE OBRA



AVANCE DE OBRA

Excavación y anclajes

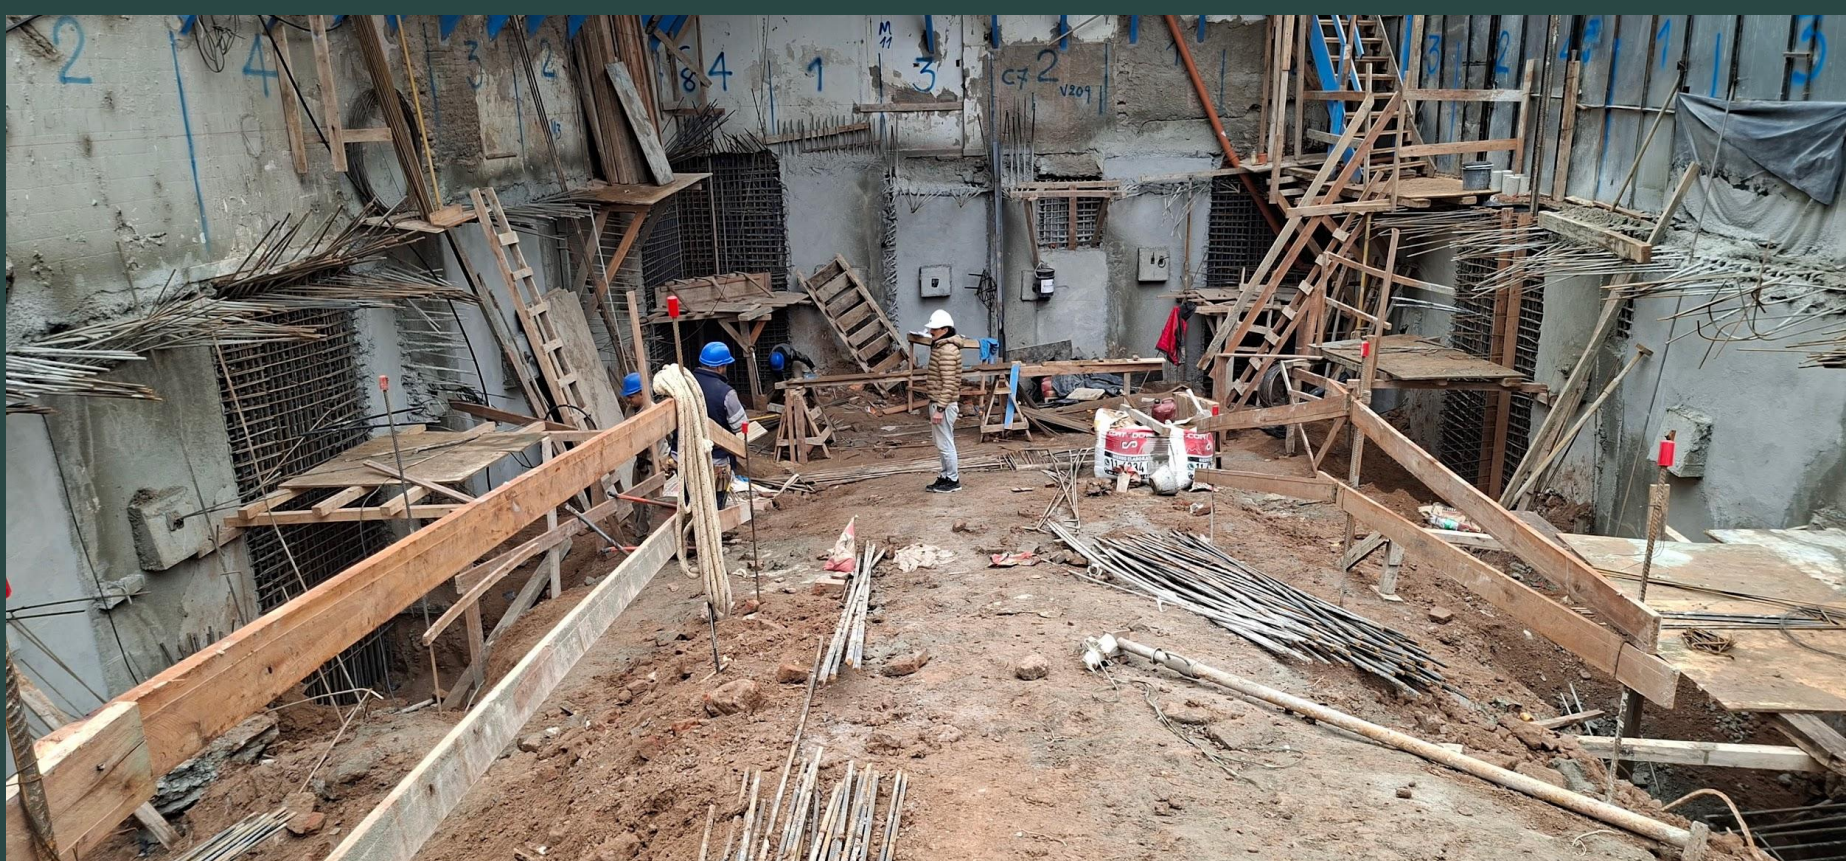

Se realizó la excavación de la secuencia N°4 de tabiques submurales, perforación y llenado de anclajes, armado y gunitado de tabiques

AVANCE DE OBRA



AVANCE DE OBRA

Armado y gunitado



Secuencia N°4

AVANCE DE OBRA



AVANCE DE OBRA

Excavación




Se realizó el rebaje del suelo para comenzar con el sector del 2do subsuelo llegando a la cota de -8.80m en fundación de tabiques

AVANCE DE OBRA



AVANCE DE OBRA

Excavación

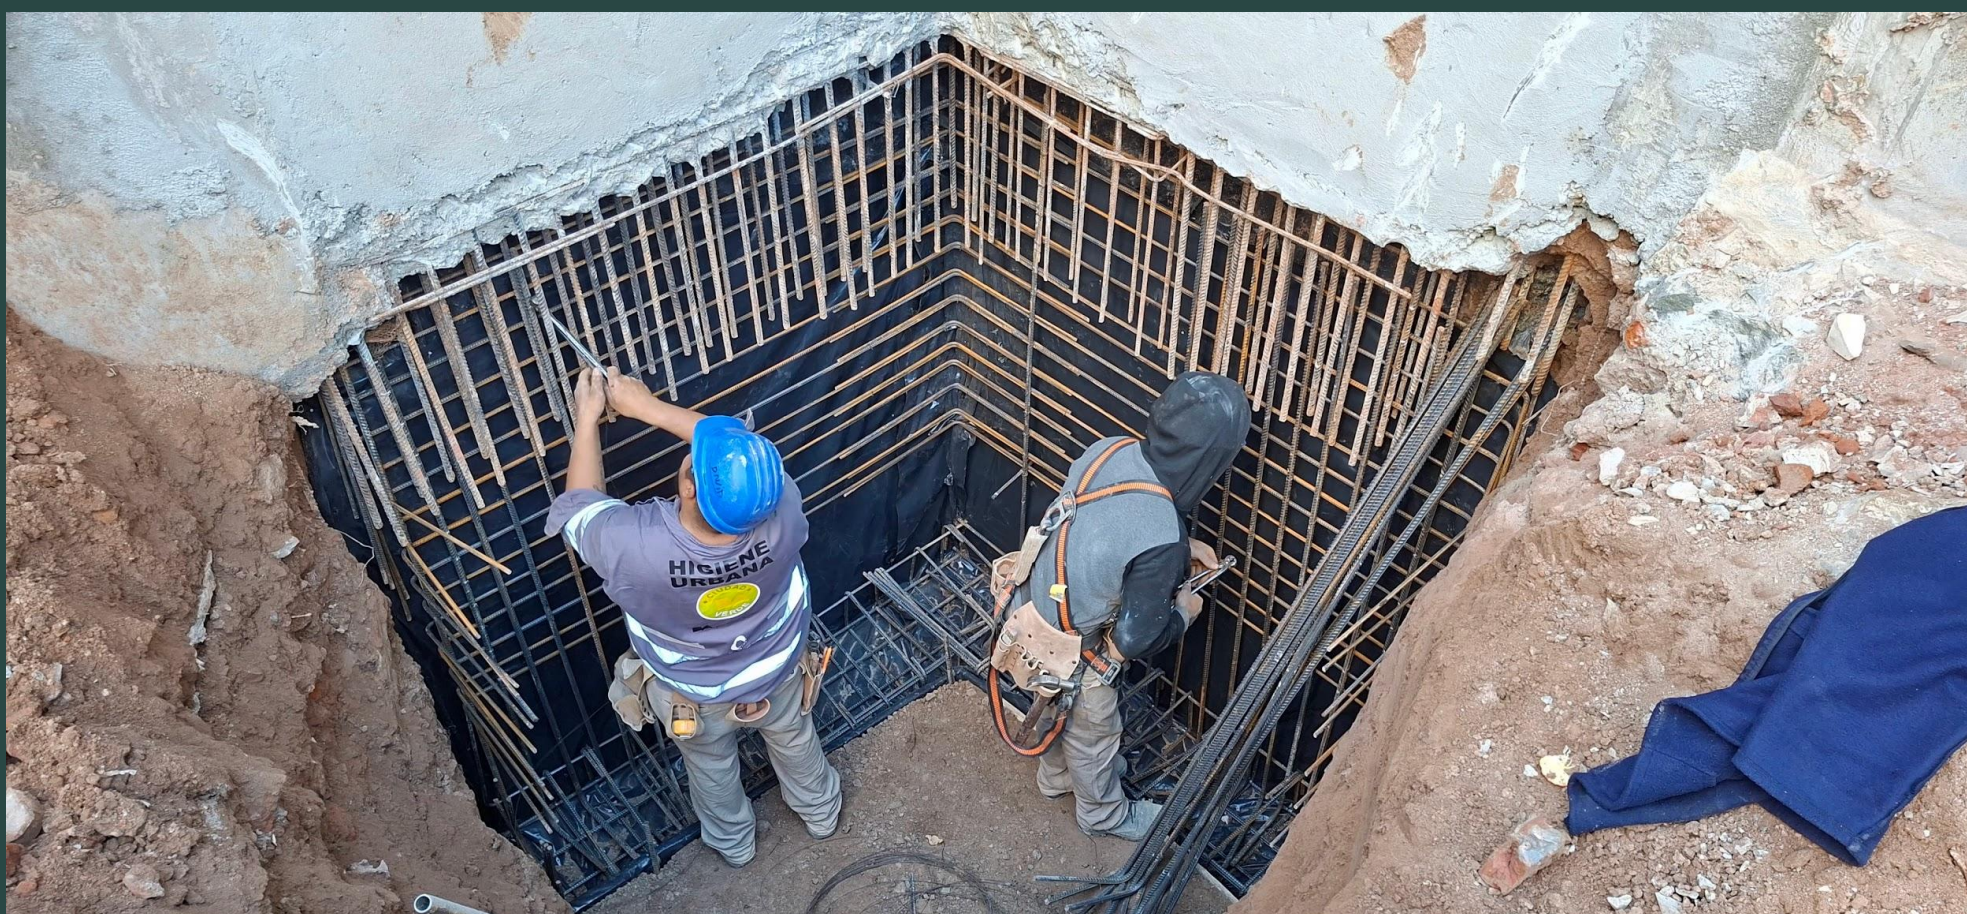

Se prevee llenar la 1ra secuencia del 2do subsuelo el 05/08.

AVANCE DE OBRA

En este proyecto participan:

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura

Comercializa:

interwin
5275-4200

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail

info@grevia.com.ar

Teléfono

54 11 4804 4049

