

Avance de obra
Nro 35
Agosto 2026

GBXI
Pacheco de Melo
2592

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura





AVANCE
DE OBRA





CONTRAFRENTE

Ladrillo Visto

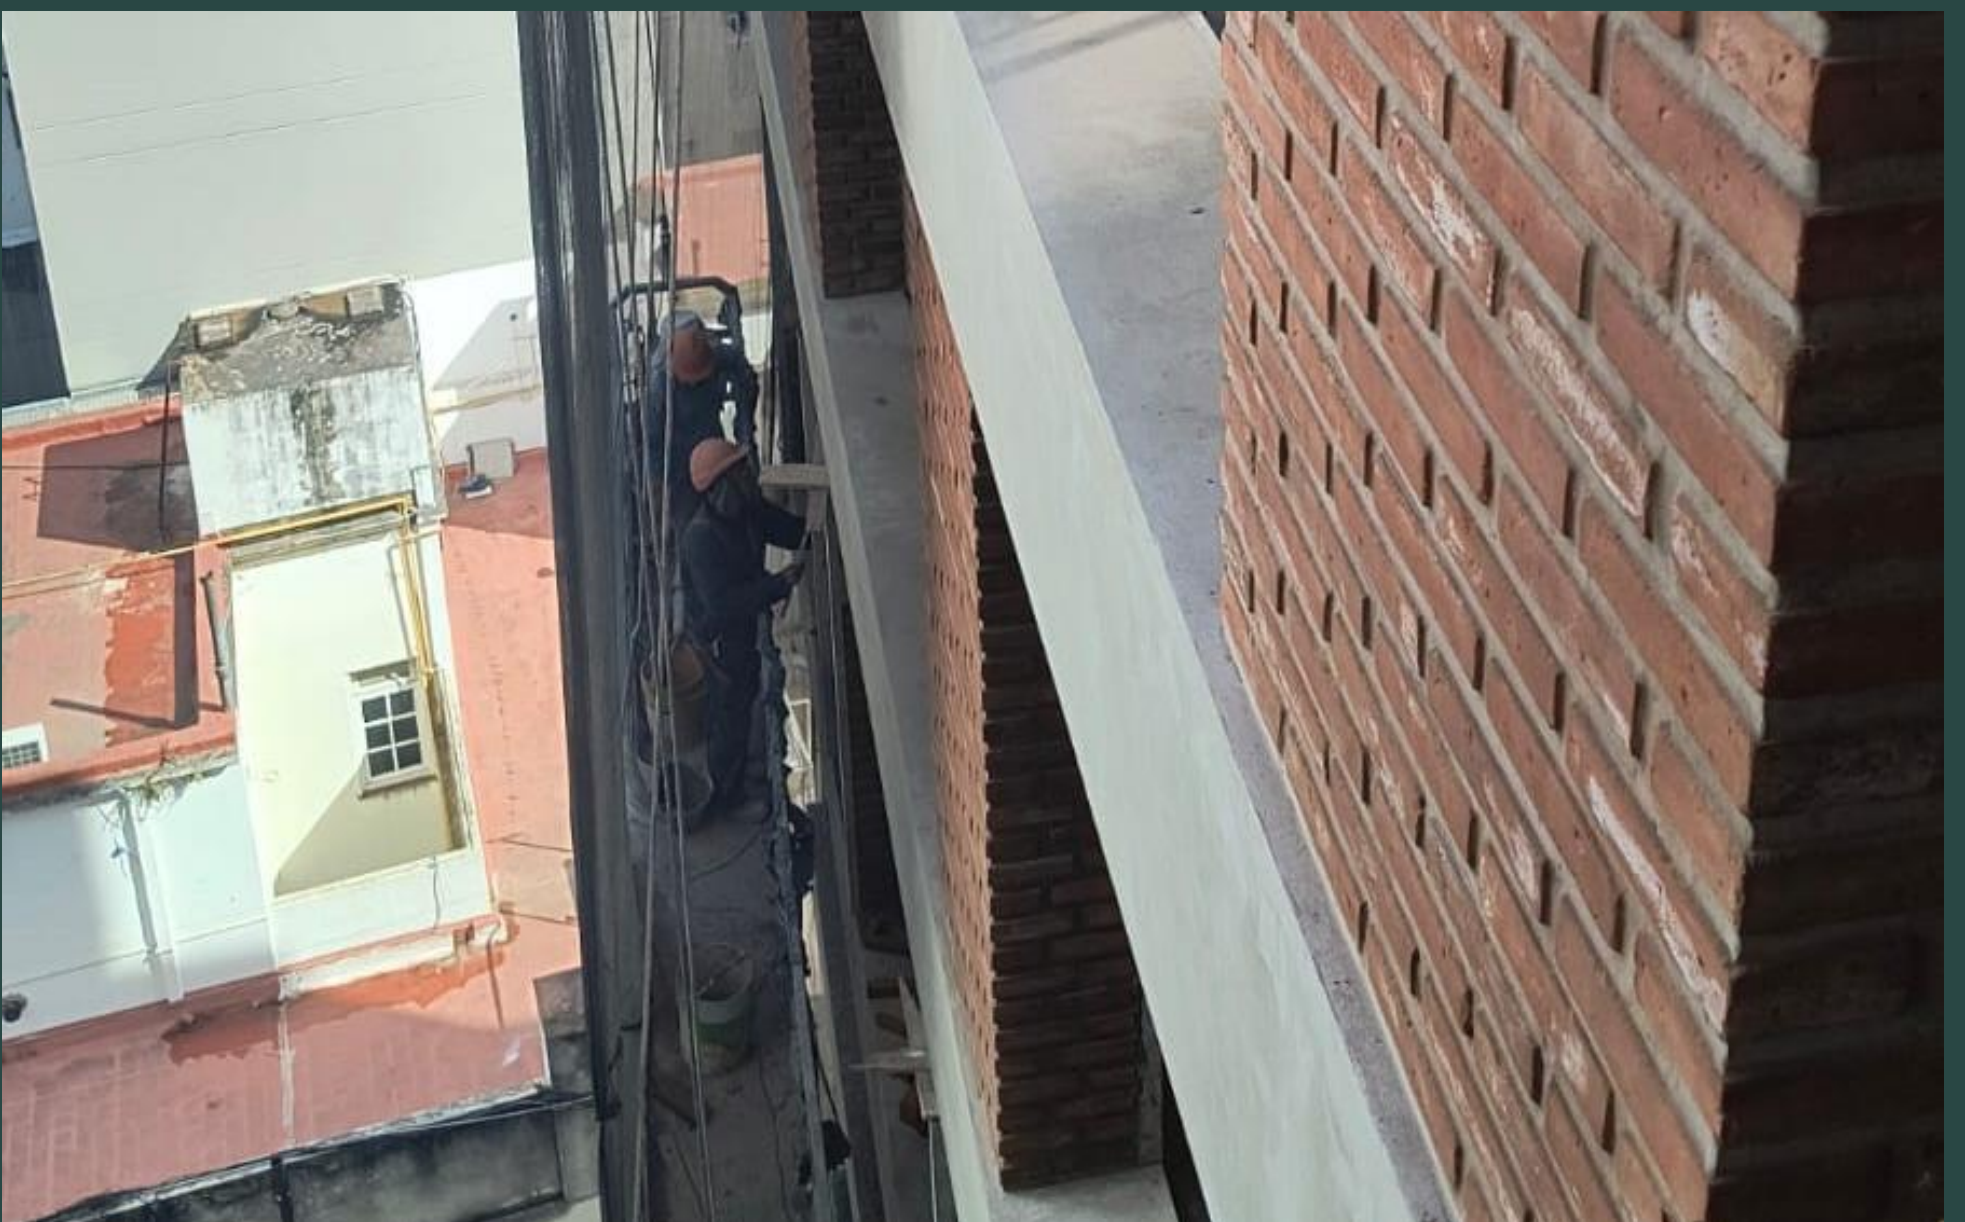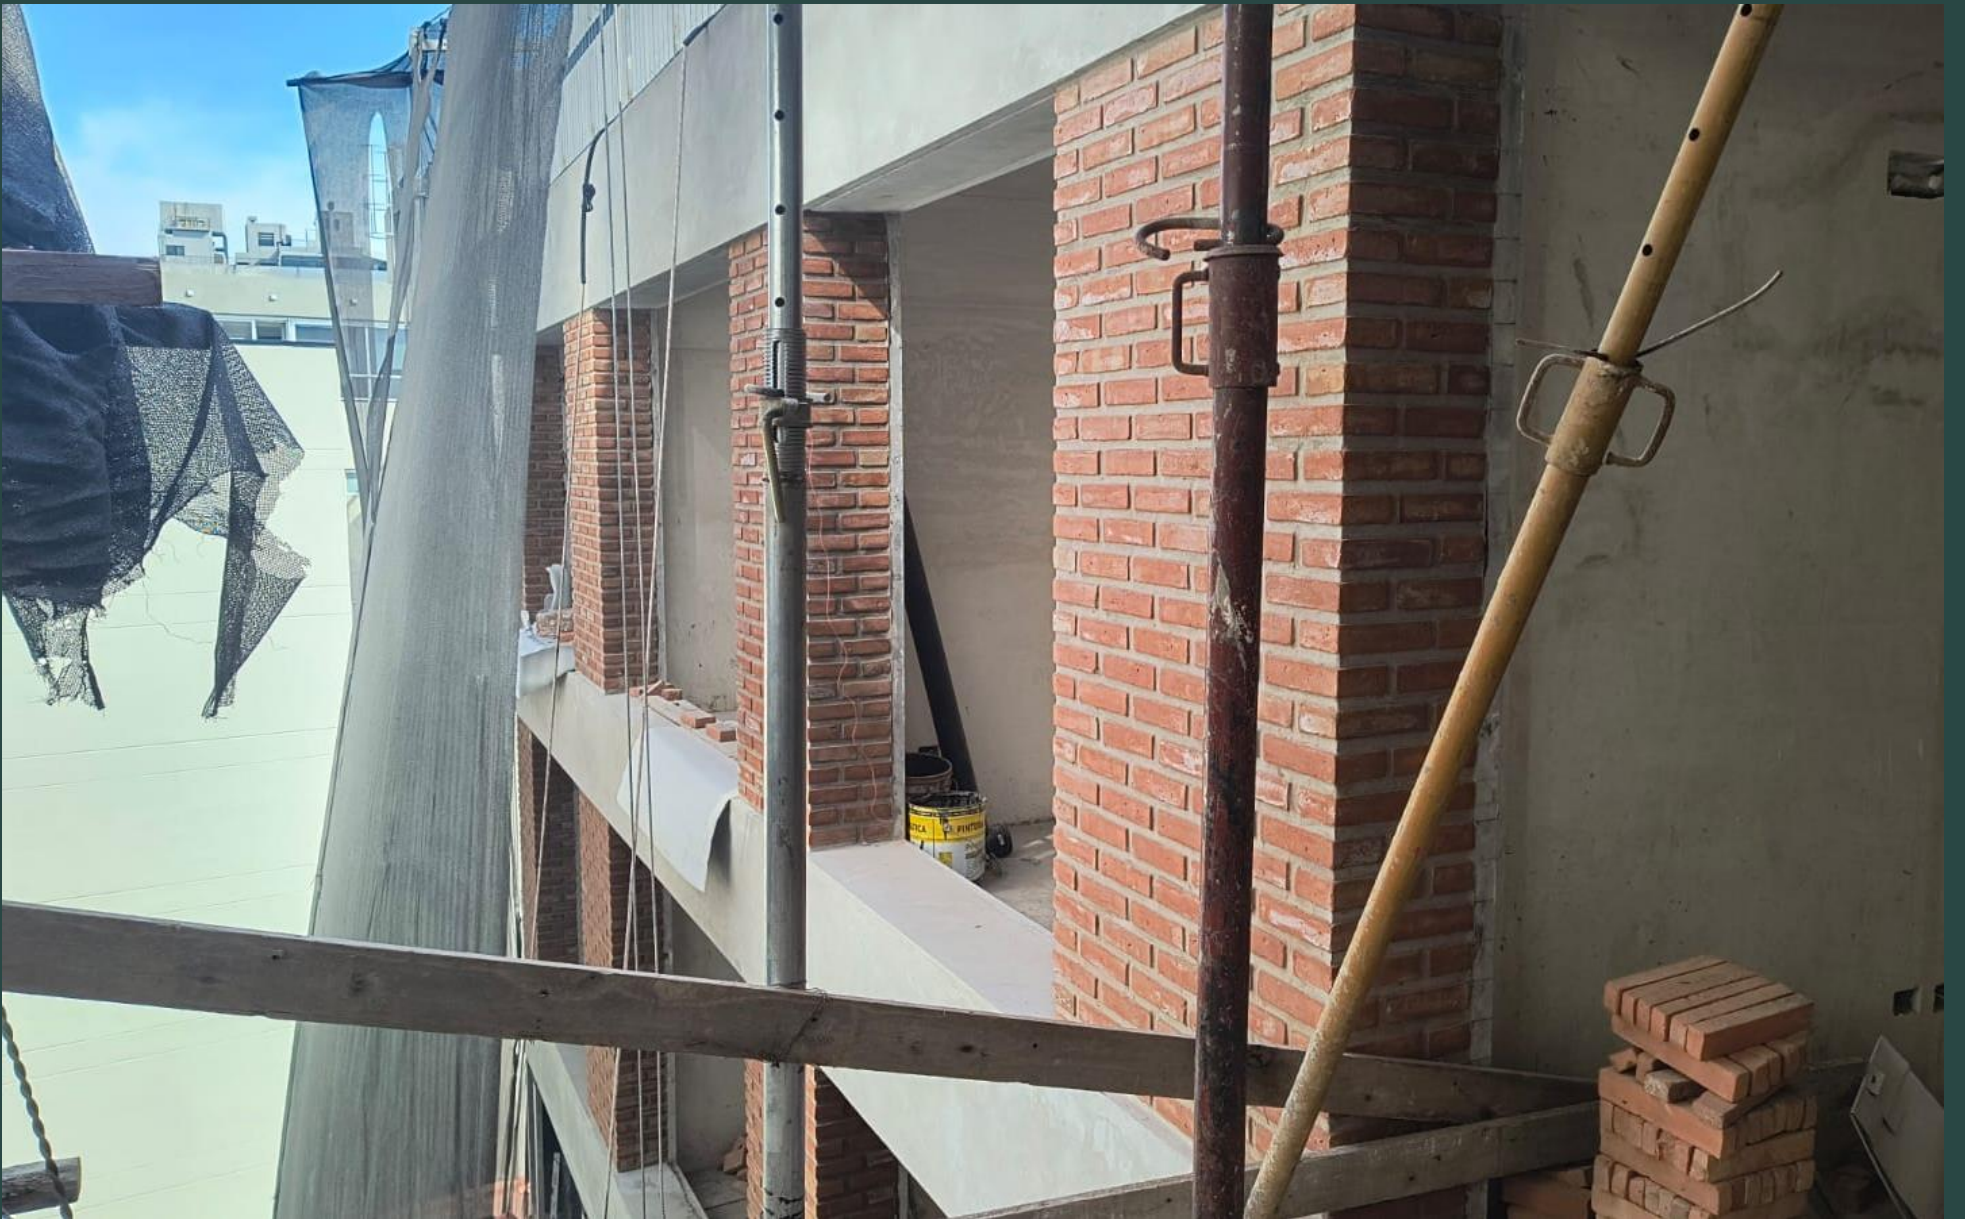



Este mes continuamos con la colocación de ladrillo visto en el contra frente del edificio, trabajando en la totalidad de los pisos.

AVANCE DE OBRA



PINTURA

Unidades funcionales

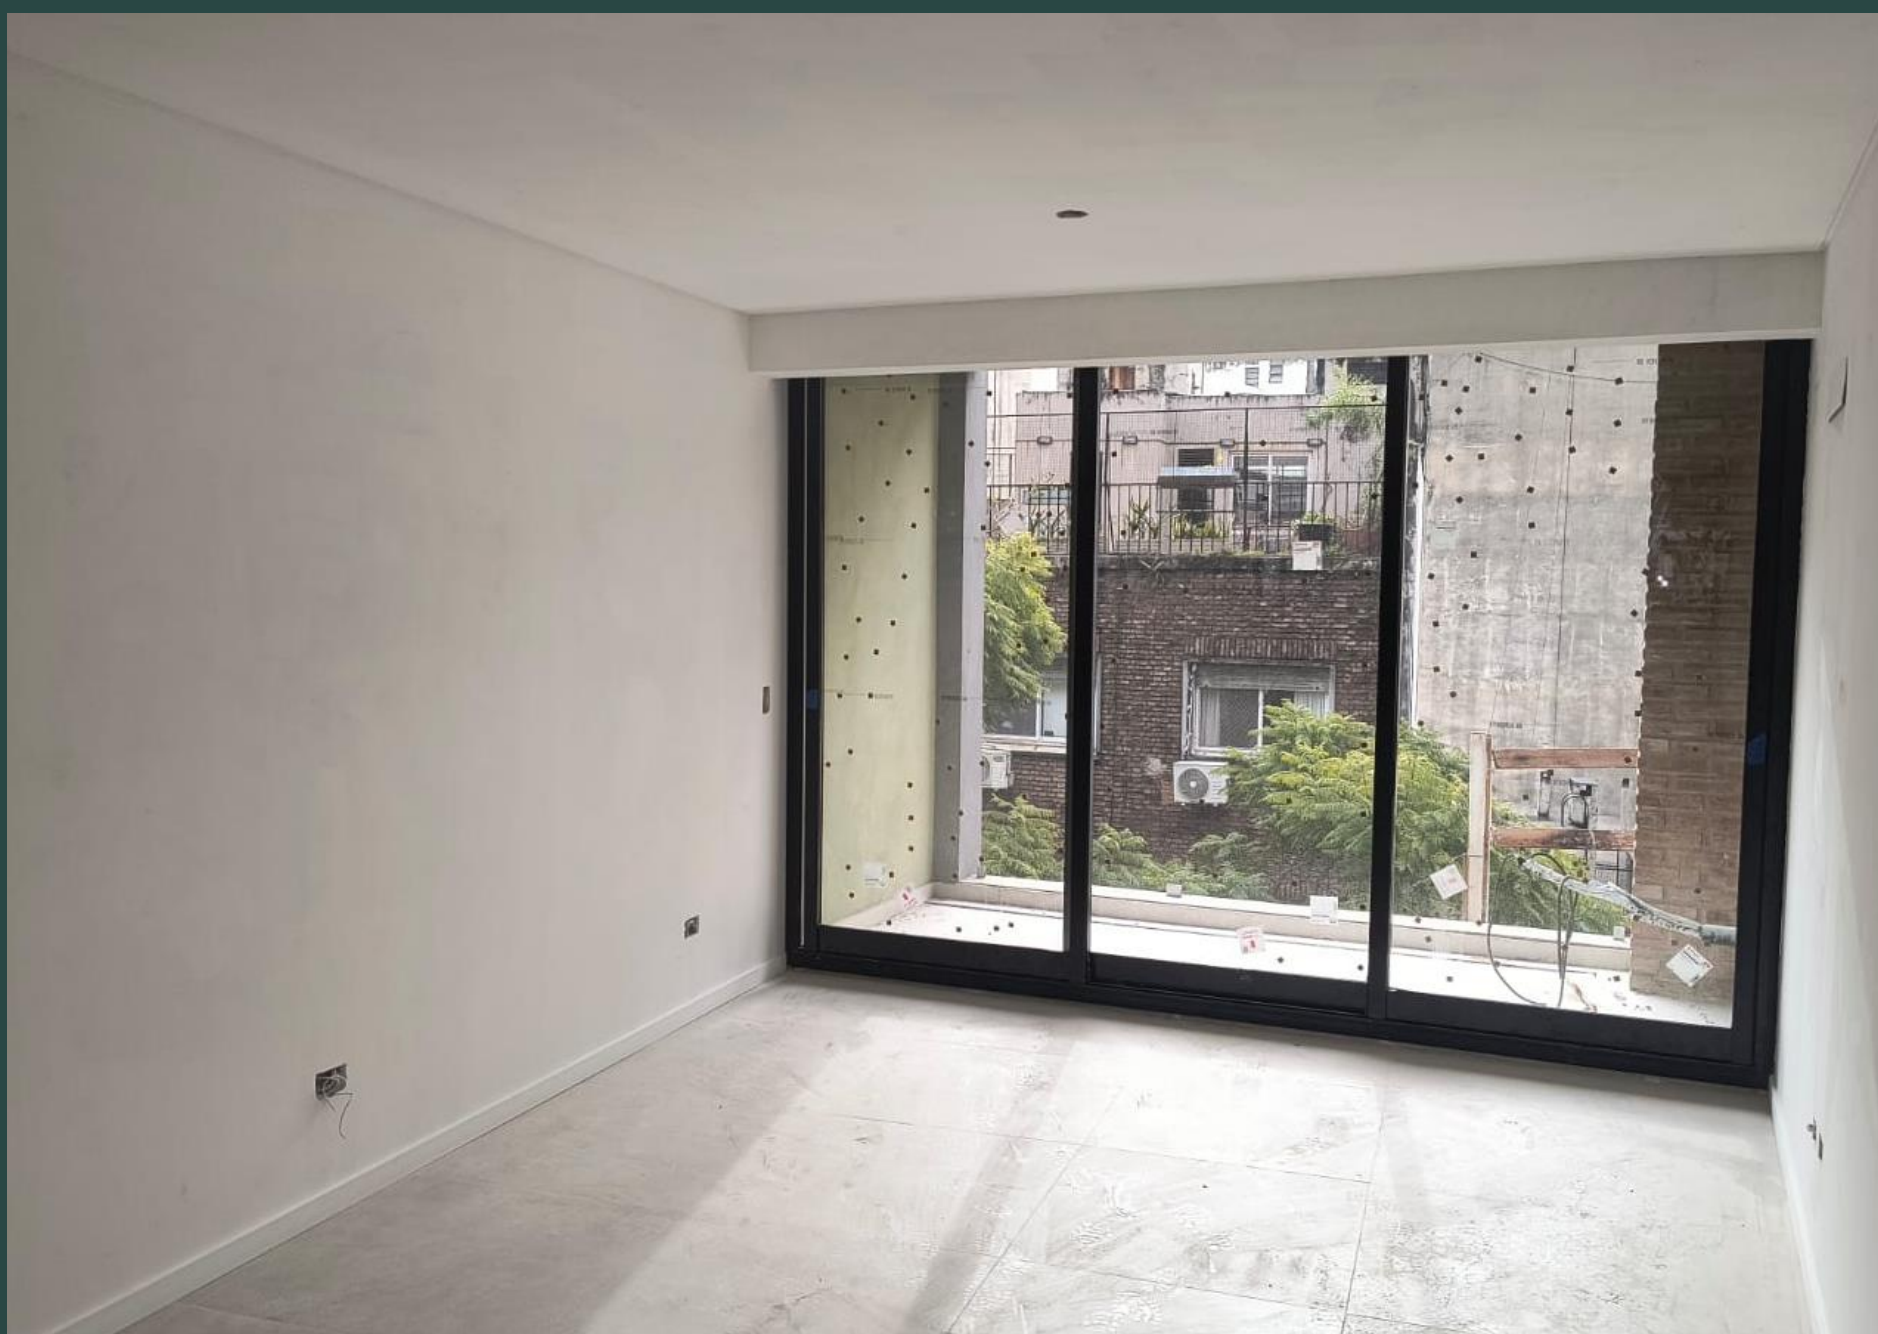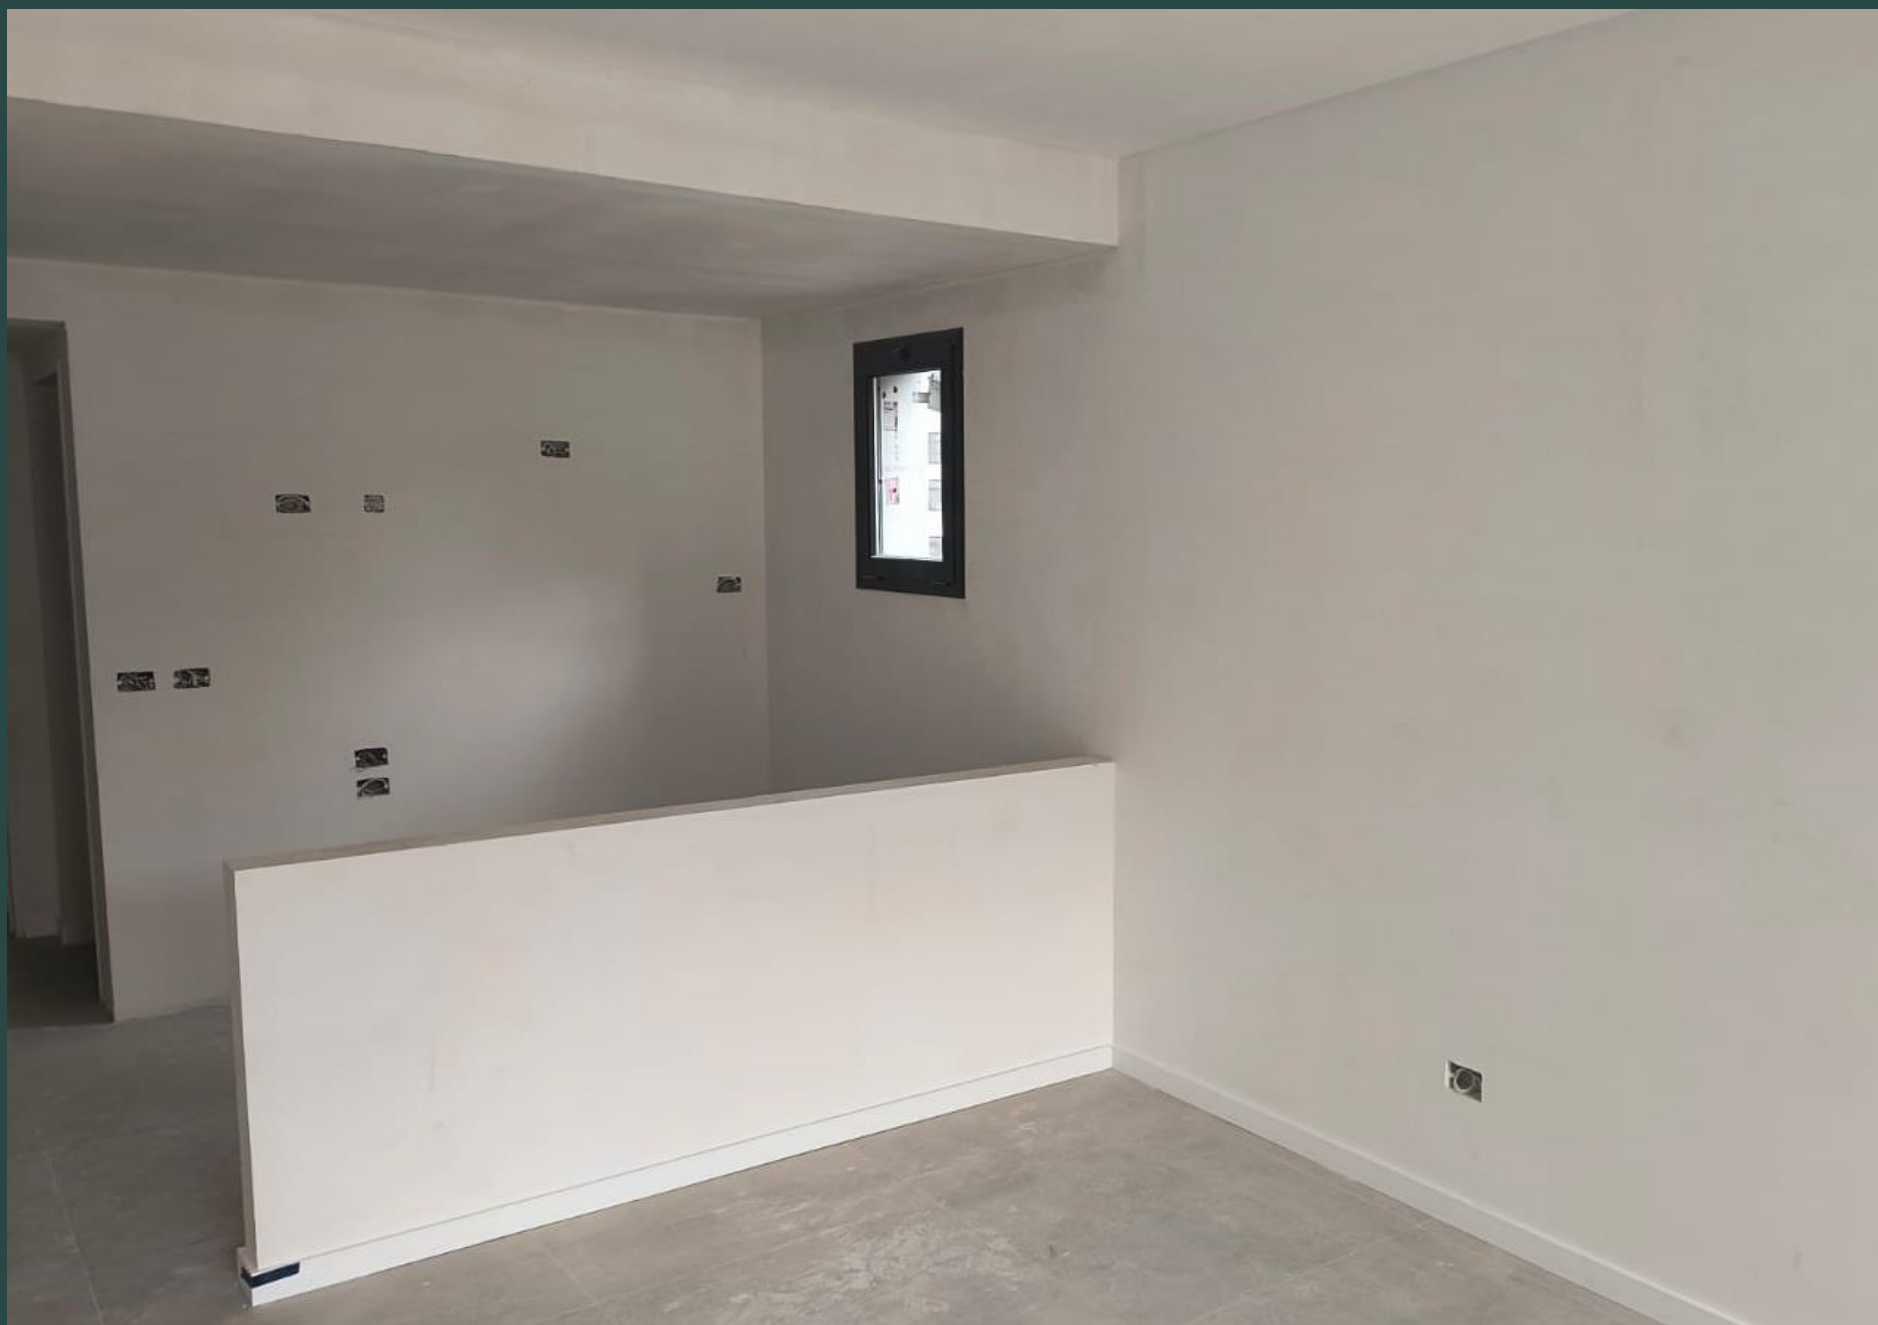

Este mes comenzamos a realizar las manos de imprimación en las unidades funcionales del piso 2 al 4.

AVANCE DE OBRA



COLOCACIÓN

Revestimientos y pisos



Continuamos con el revestimiento de baños y colocación de pisos a lo largo de todo el mes, alcanzando el piso 9.

AVANCE DE OBRA



HERRERÍA

Barandas de balcones



Este mes se finalizó la colocación de barandas metálicas en la terraza. A su vez se realizó la impermeabilización de toda la terraza para posteriormente realizar la carpeta.

AVANCE DE OBRA



CARPINTERÍA

Muebles de cocina



Comenzamos con el montaje de los muebles de cocina, actualmente teniendo pisos 2 y 3 completos y listos para instalación de mesadas.

AVANCE DE OBRA



PLOMERÍA

Instalación Sanitaria



Durante todo el mes tuvimos avances en las instalaciones sanitarias. Se continuó con el montaje de cañerías cloacales y desagües pluviales de la PB, alcanzando también el tendido de los mismos en los subsuelos.

AVANCE DE OBRA



ZÓCALOS

Unidades funcionales



A lo largo del mes se realizó la colocación de los zócalos en todas las unidades funcionales del piso 2 al 7.

AVANCE DE OBRA



Así se ve la fachada y
pisos en altura hoy.



En este proyecto participan:

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura

Comercializa:

interwin
5275-4200

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail

info@grevia.com.ar

Teléfono

54 11 4804 4049

