


Avance de obra
Nro 20
Agosto 2026

GBXIV

Virrey del Pino


2268

Proyecta:



PARYSOW +
SCHARGRODSKY
ARQUITECTOS

Dirección de obra:




Molinaro | Fenoglio
arquitectos




AVANCE
DE OBRA





MAMPOSTERÍA ejecución

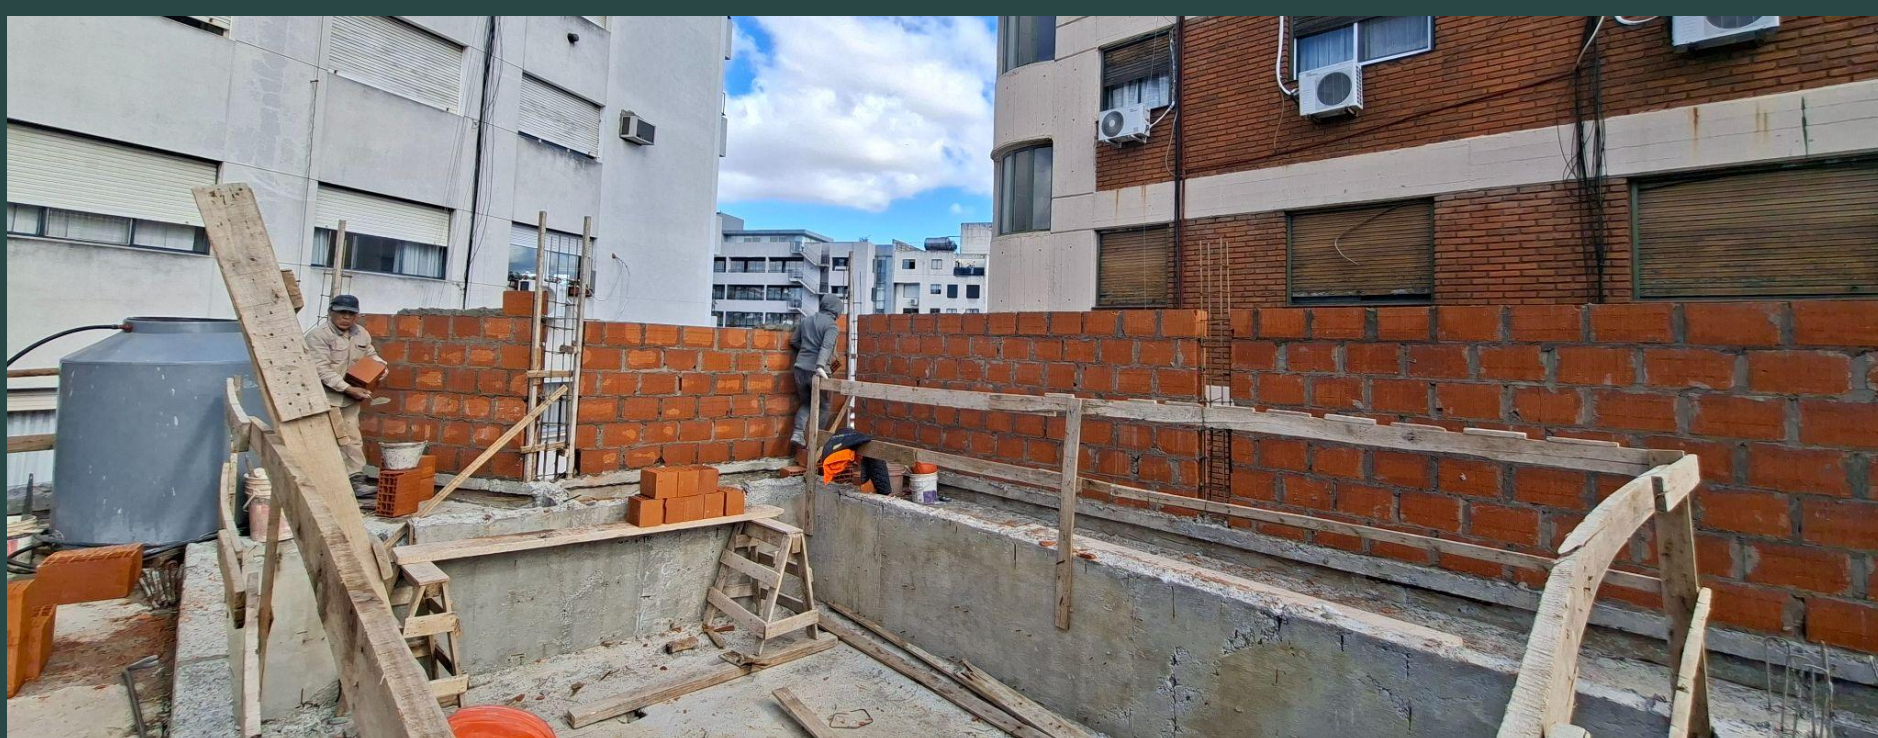

08/26

Durante el mes de agosto se ejecutaron las paredes medianeras en los pisos 9 y 10. En simultáneo se realizaron las paredes interiores de los departamentos del piso 9.

AVANCE DE OBRA



VENTILACIÓN FORZADA




08/26

Se comenzó con el tendido de cañería de ventilación forzada en baños, toilettes y palieres.

AVANCE DE OBRA



INSTALACIÓN SANITARIA

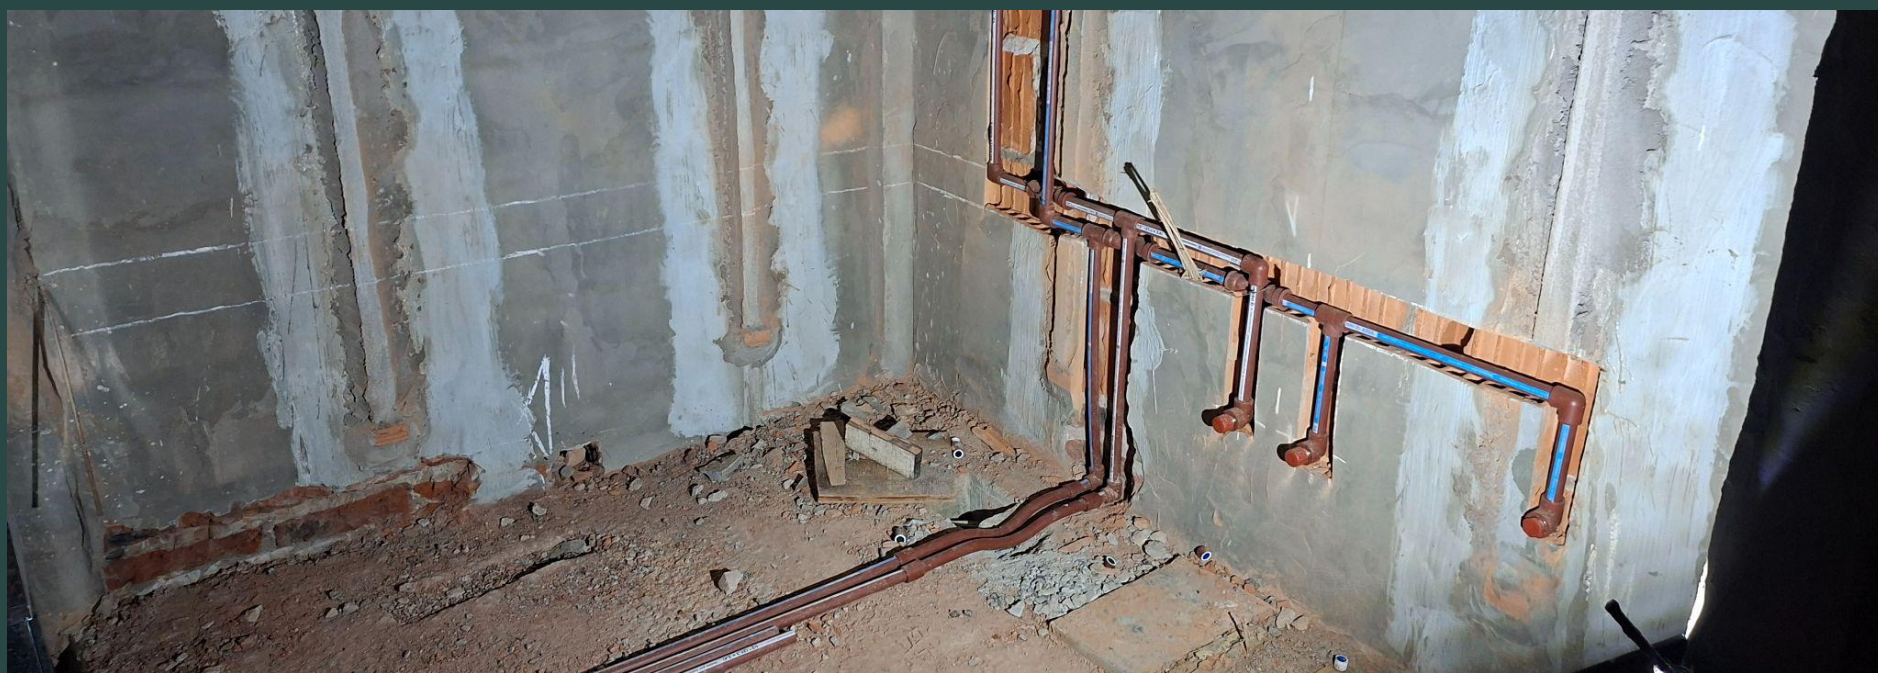

08/26

Se concluyó la instalación sanitaria de provisión de agua fría y caliente, desagües cloacales y pluviales en el 2do y 3er piso y se dio inicio a los mismos trabajos en 4to y 5to piso.

AVANCE DE OBRA



ELECTRICIDAD




08/26

Se terminó con la colocación de cajas de toma y teclas de luz en las unidades funciones del 2do y 3er piso y se comenzó con dichos trabajos en el 4to y 5to piso.

AVANCE DE OBRA



BARANDAS de BALCÓN

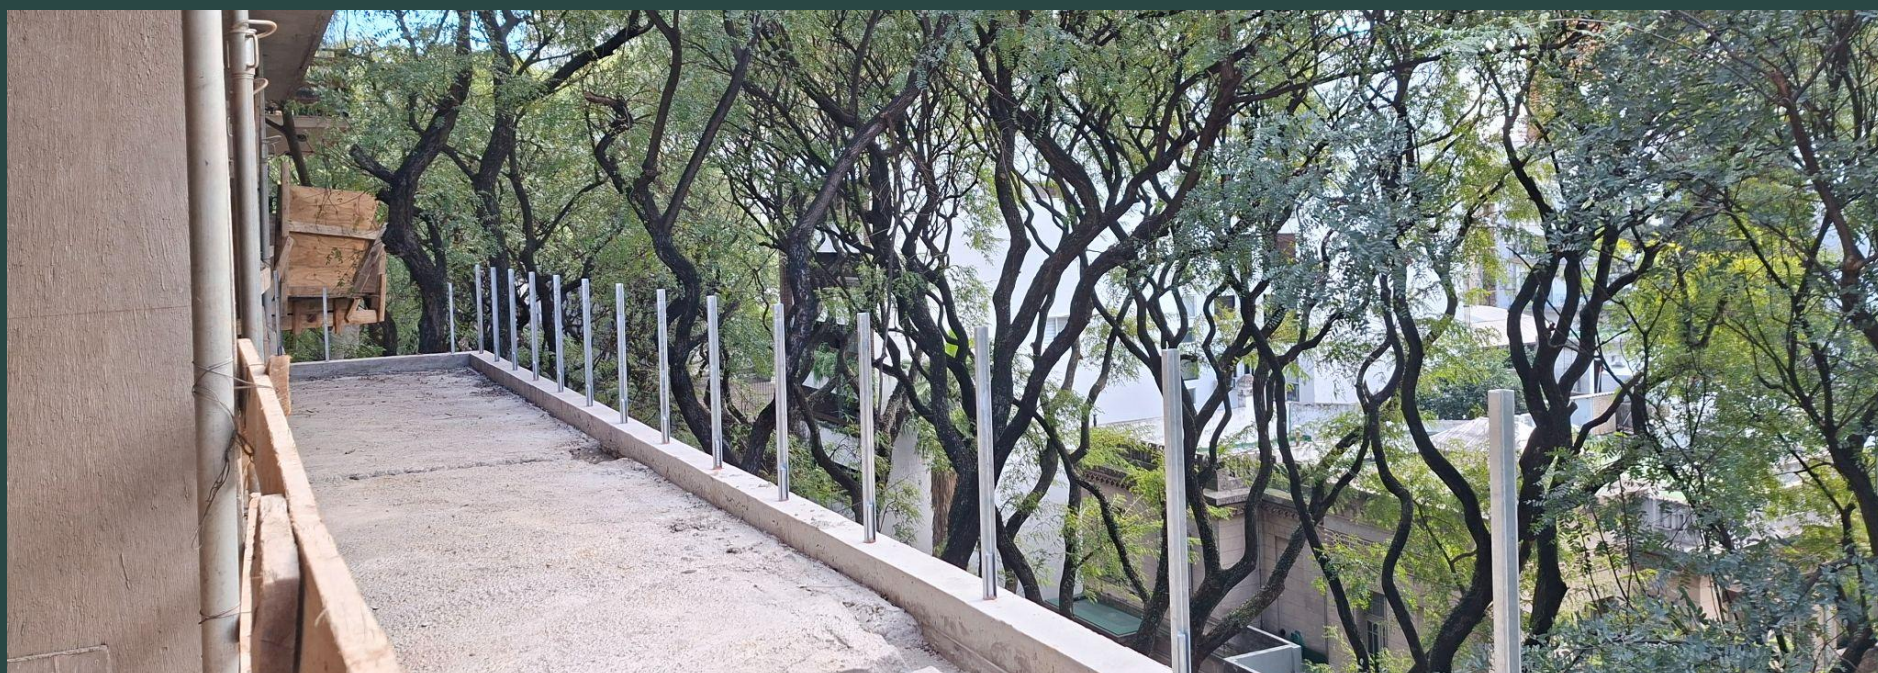

08/26

Se inició con la colocación de insertos para las barandas de
balcón.

AVANCE DE OBRA




AVANCE DE OBRA




En este proyecto participan:

Proyecta:



PARYSOW +
SCHARGRODSKY
ARQUITECTOS

Dirección de obra:



Molinaro | Fenoglio
arquitectos

Comercializa:

interwin
5275-4200

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail

info@grevia.com.ar

Teléfono

54 11 4804 4049

