

Avance de obra
Nro 12
Agosto 2026

Sinclair
3249

Proyecto y Dirección de obra:

suelo
arquitectura



AVANCE
DE OBRA





ESTRUCTURA

Estructura de Elevación



Se continúa con el armado de hierros y encofrados de la losa sobre primer piso.

AVANCE DE OBRA



ESTRUCTURA

Estructura de Elevación



Se ejecuta el tendido de las cañerías de electricidad dentro de losa y el armado completo de hierros de la misma.

AVANCE DE OBRA



ESTRUCTURA Hormigon





Se realiza la hormigonada correspondiente a la losa sobre primer piso.

AVANCE DE OBRA



ESTRUCTURA

Estructura de elevación

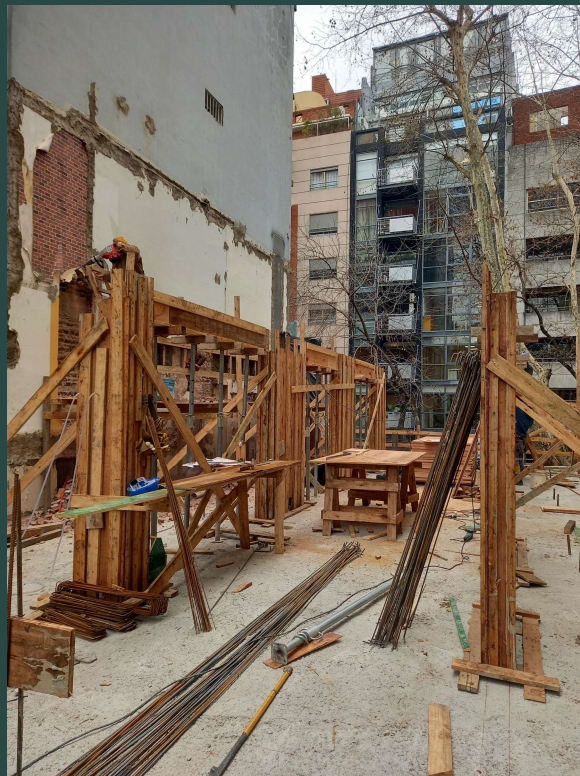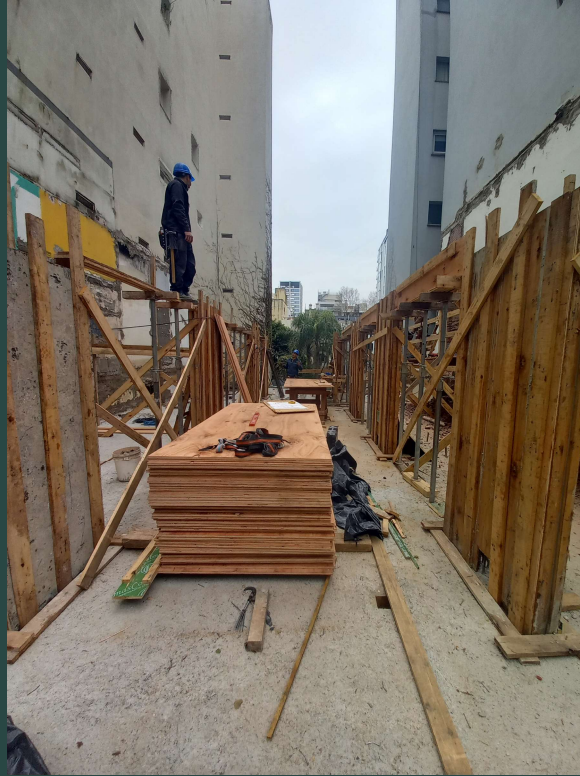

Se comienza el replanteo y armado de encofrados de la losa sobre segundo piso, avanzando con la estructura correspondiente.

AVANCE DE OBRA



ESTRUCTURA

Estructura y electricidad



Se completa el armado de losas, columnas y vigas.
También se realiza el tendido de cañerías de electricidad.

AVANCE DE OBRA



ESTRUCTURA
Hormigon



Se realiza la segunda hormigonada del mes correspondiente a la losa sobre segundo piso.

AVANCE DE OBRA

En este proyecto
participan:

Proyecta y Dirección de Obra:

suelo
arquitectura

Comercializa:

COVELLO ■
P R O P I E D A D E S

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail

info@grevia.com.ar

Teléfono

54 11 4804 4049

