

Avance de obra
Nro 3
Agosto 2026

GBXVI
Guatemala
4487

Proyecta:

ABRAMZON

ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura



**AVANCE
DE OBRA**





AVANCE DE OBRA

Hormigón



El 05/08 se realizó el gunitado de la 1ra secuencia de submurales del segundo anillo.

AVANCE DE OBRA



AVANCE DE OBRA

Excavación




Se realizó el movimiento de suelo para realizar la secuencia N°2 del segundo anillo de troneras para submurales.

AVANCE DE OBRA



AVANCE DE OBRA

Armado y gunitado

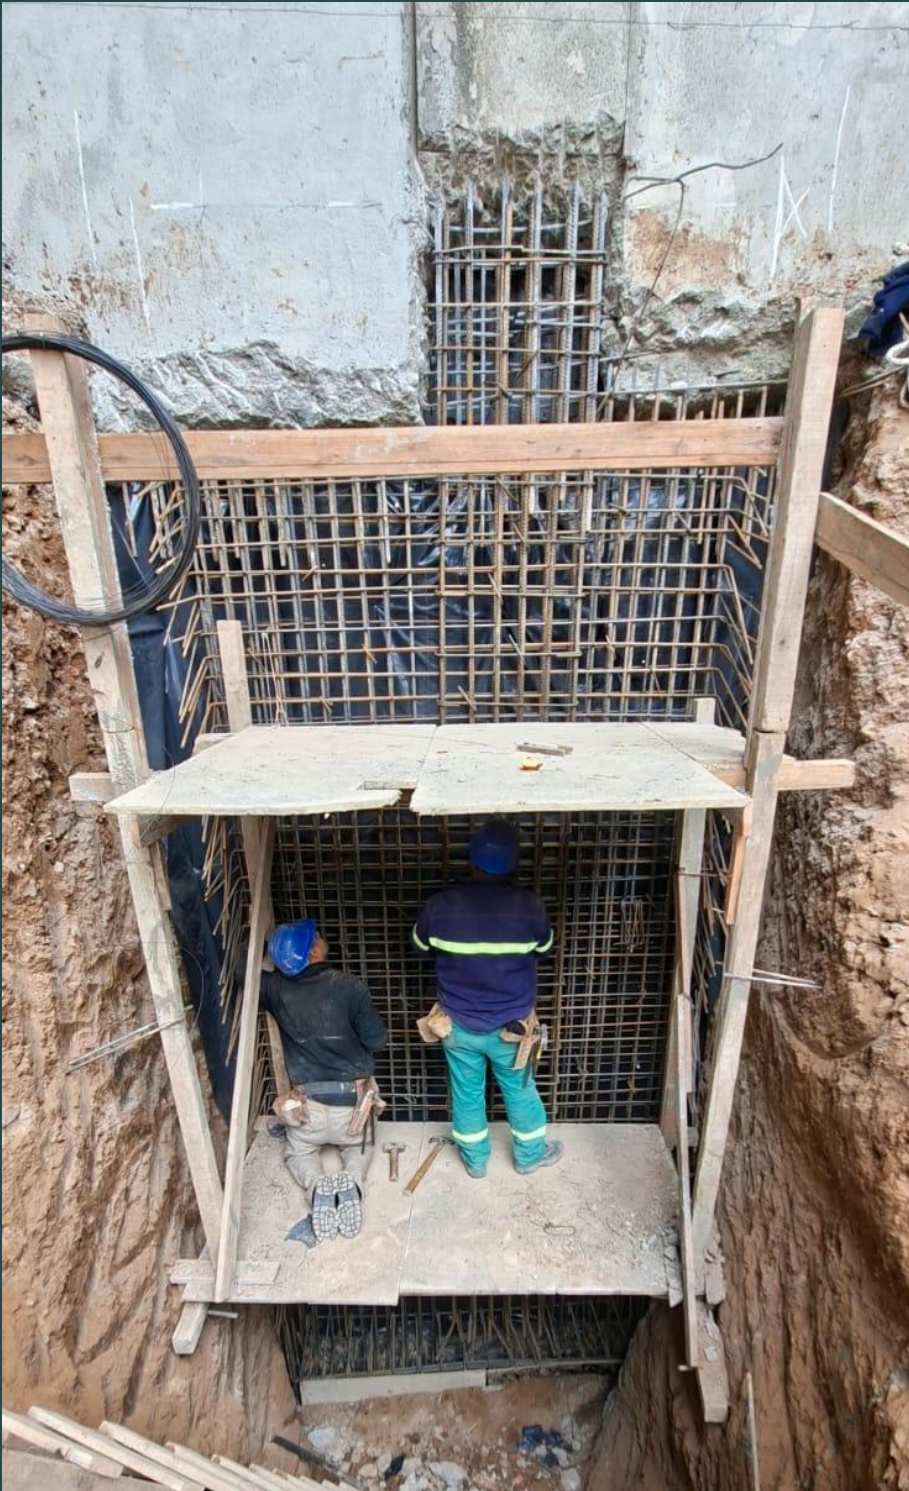



Se realizó el perfilado, armado y llenado de dicha secuencia

AVANCE DE OBRA



AVANCE DE OBRA

Excavación y armado

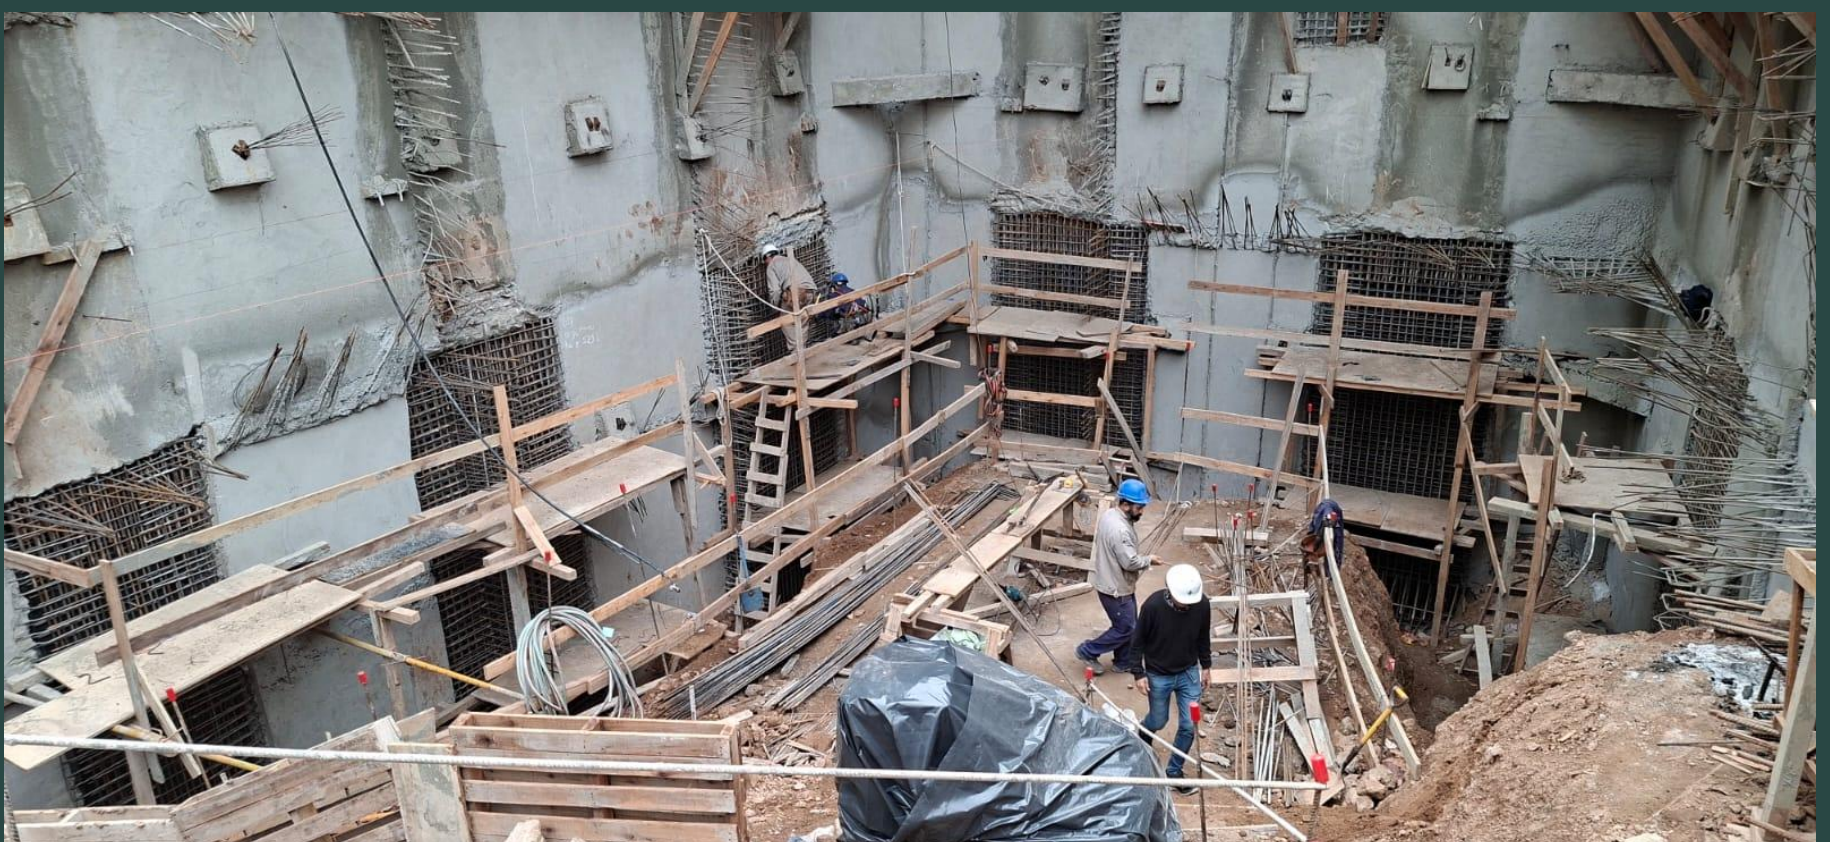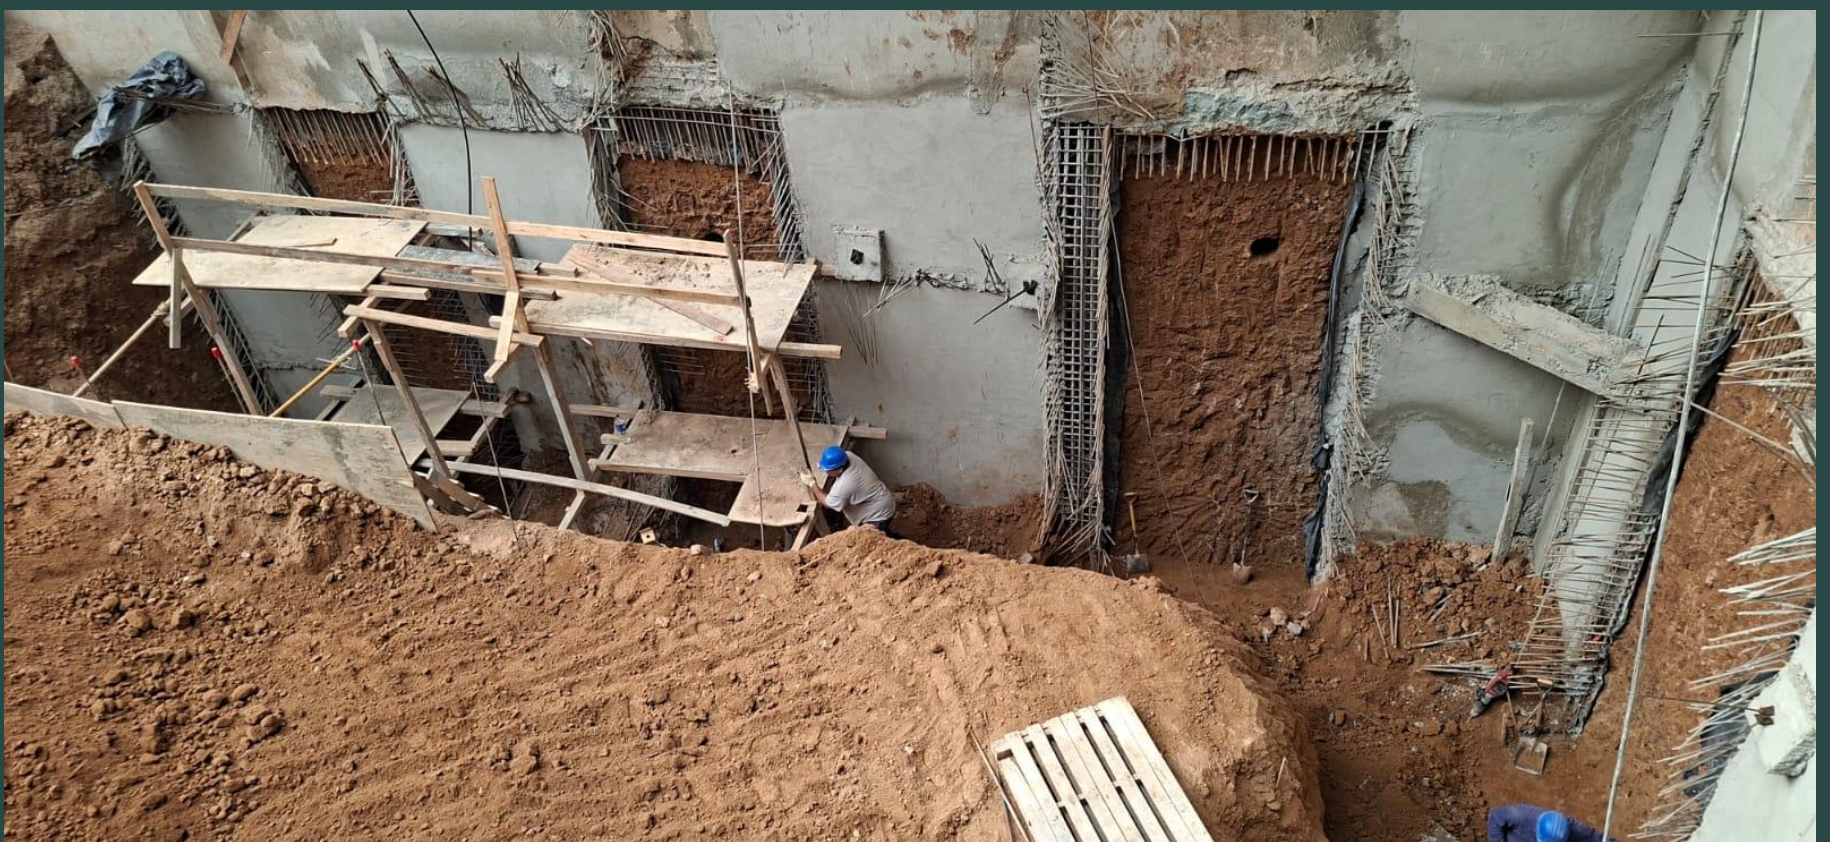

Se realizó la excavación de la secuencia final del segundo anillo submural. Los tabiques se encuentran perfilados y armados esperando a ser llenados el 03/09 para luego pasar a las bases.

AVANCE DE OBRA

En este proyecto participan:

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura

Comercializa:

interwin
5275-4200

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail

info@grevia.com.ar

Teléfono

54 11 4804 4049

