GRËVIA® DESARROLLOS SUSTENTABLES

Avance de obra
Nro 22
Octubre 2026

GBXIV
Virrey del Pino 2268

Proyecta:

2PS PARYSOW + SCHARGRODSKY **ARQUITECTOS**

Dirección de obra:

mfa Molinaro | Fenoglio arquitectos

AVANCE DE OBRA



PREMARCOS de VENTANA



10/26

Durante el mes de octubre se continuó con la colocación de premarcos, para recibir posteriormente las carpinterías de aluminio.

AVANCE DE OBRA

CONTRAPISO








10/26

Durante este mes se realizaron los contrapisos alivianados con EPS en las unidades funcionales de 2do al 5to piso.

SISTEMA de CALEFACCIÓN

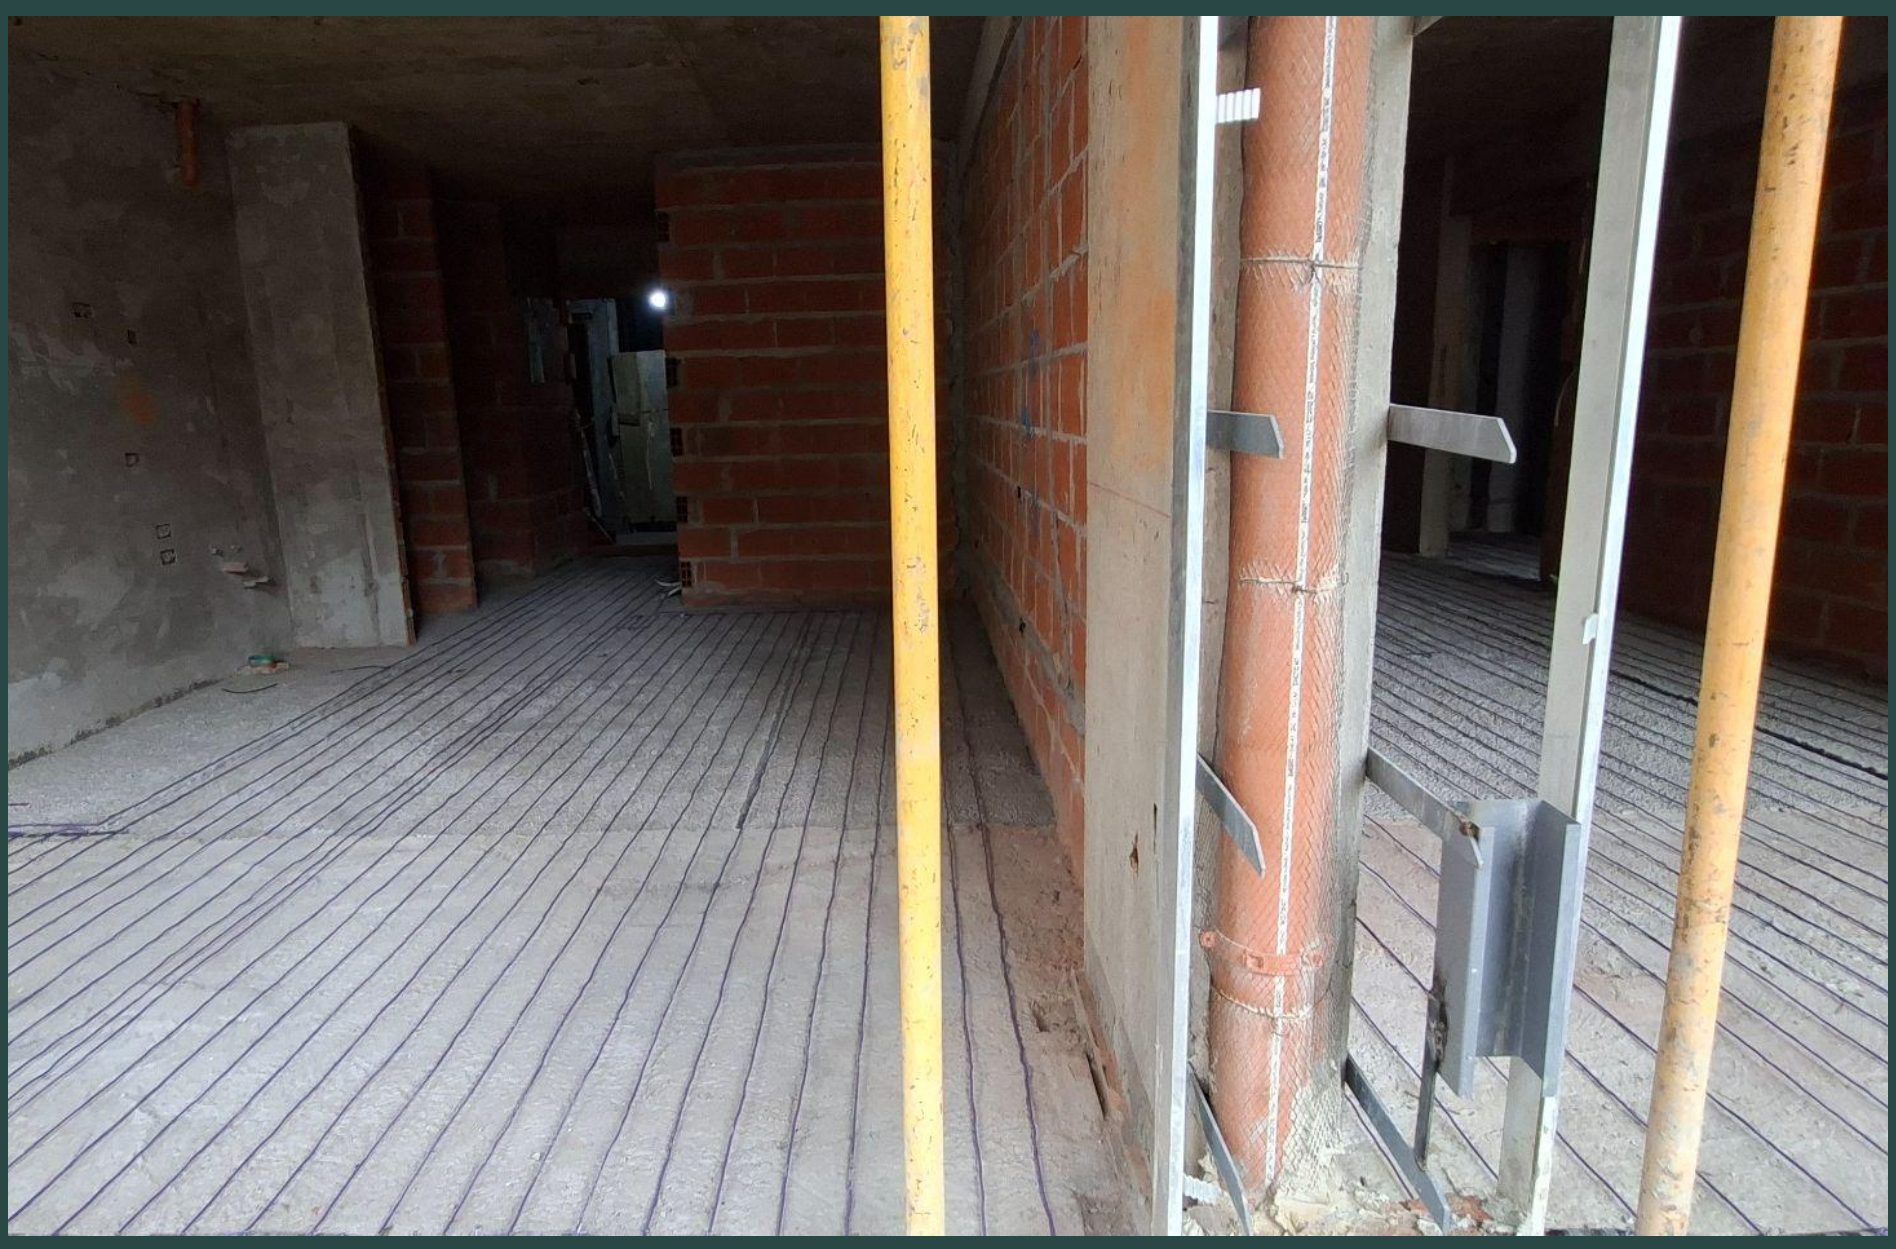



10/26


Luego del llenado del contrapiso alivianado, se comenzó la instalación del sistema de calefacción por piso radiante eléctrico del 2do al 4to piso. Este sistema permite regular la temperatura de los ambientes de manera independiente en cada departamento.

AVANCE DE OBRA

HERRERÍA
escalera - baranda





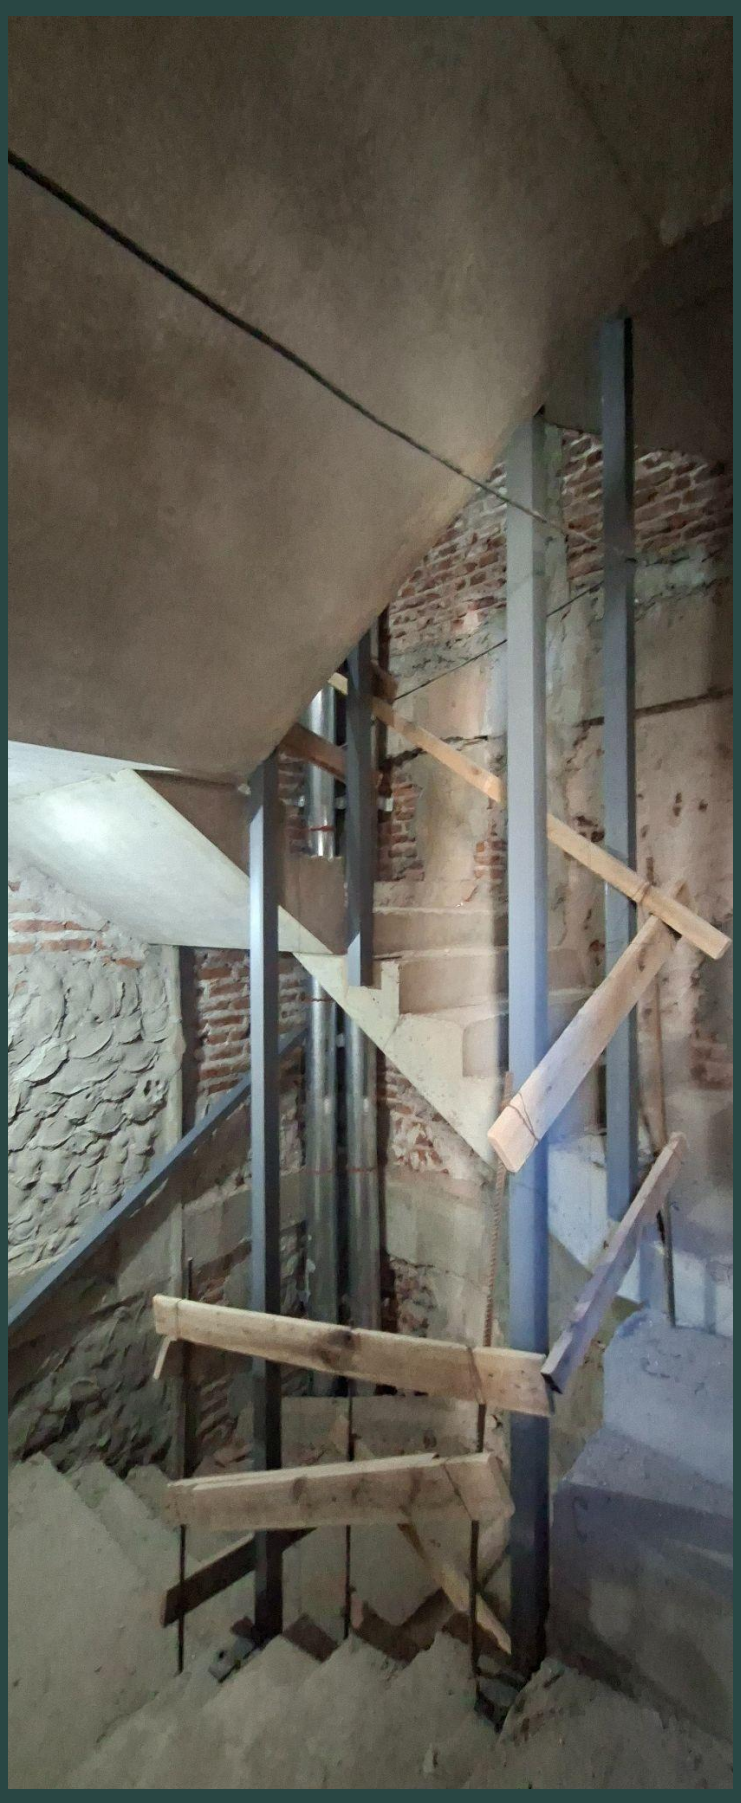

10/26

Se comenzó con el montaje de la estructura tubular para armar el ojo de la escalera y su correspondiente baranda.

CARPETAS




10/26

Se ejecutaron las carpetas niveladoras en las unidades funcionales del 2do al 4to piso.

MEDIANERAS
revoque exterior



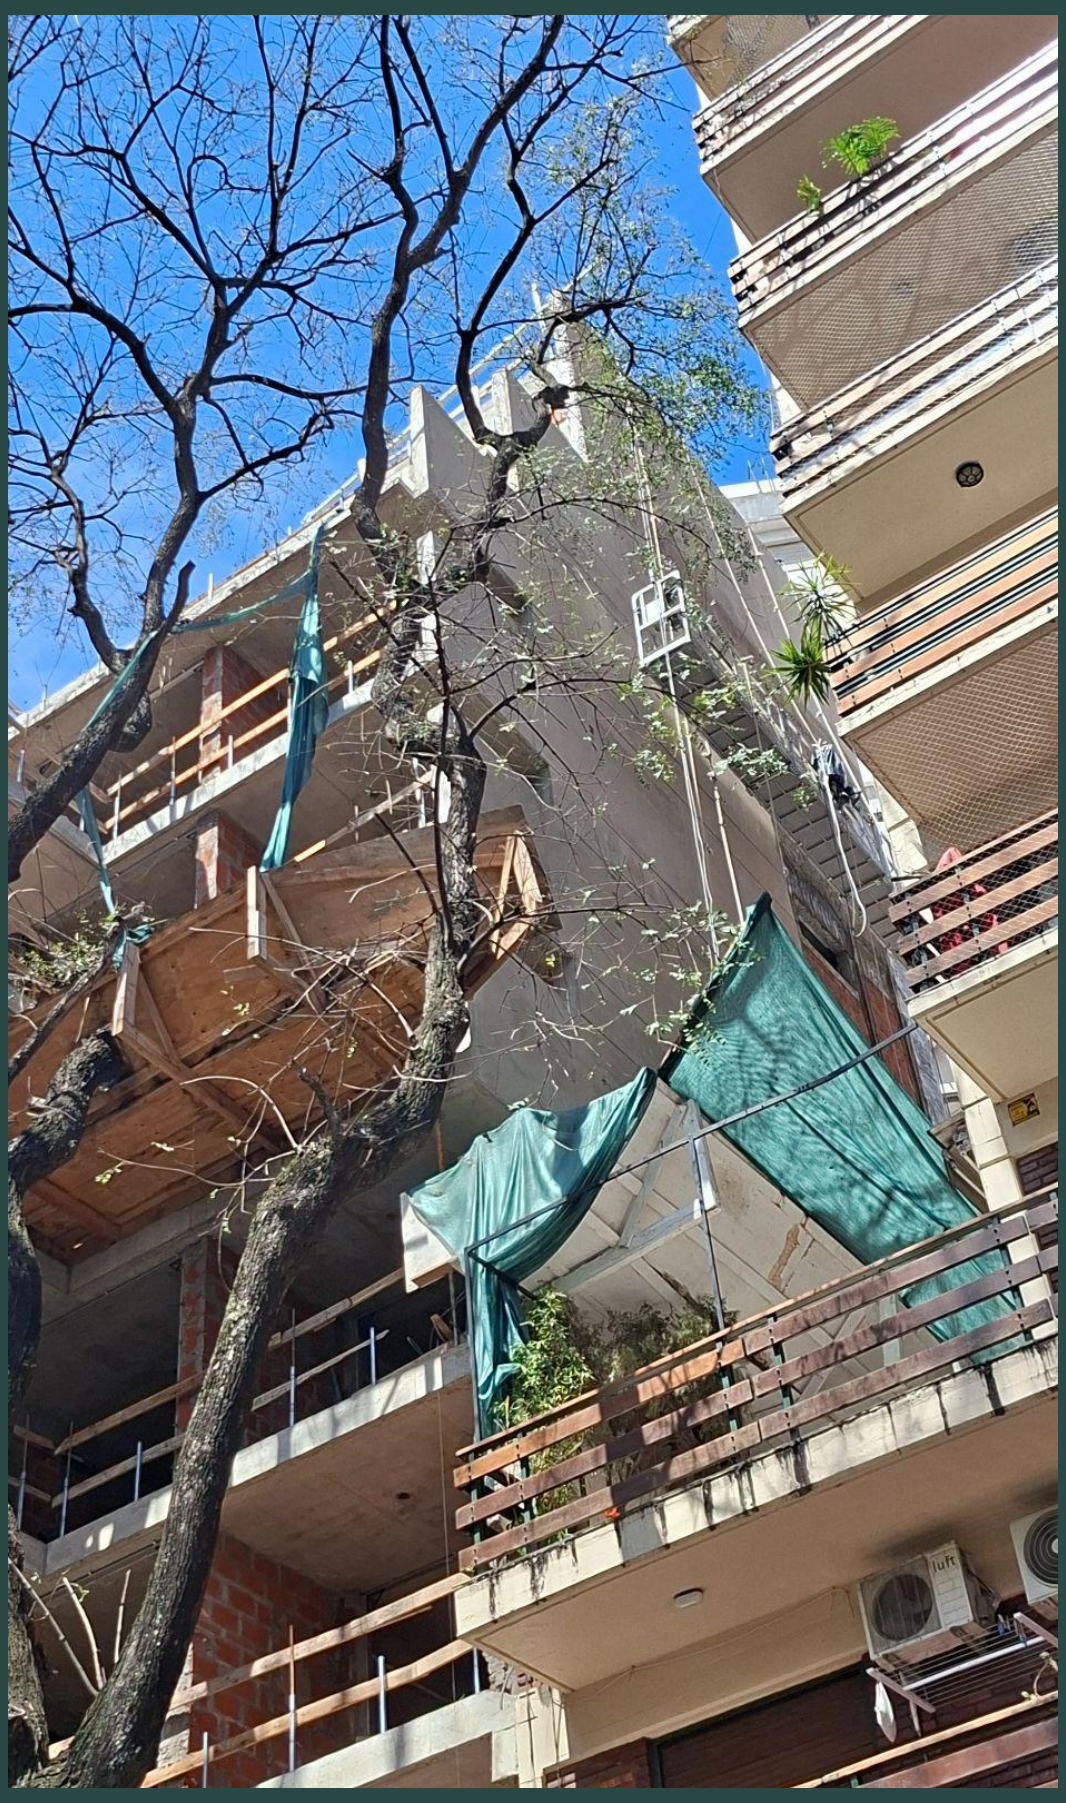




10/26

En la medianera derecha del edificio se comenzaron los revoques exteriores, cumpliendo la normativa municipal de utilizar balancines eléctricos para su ejecución.

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA

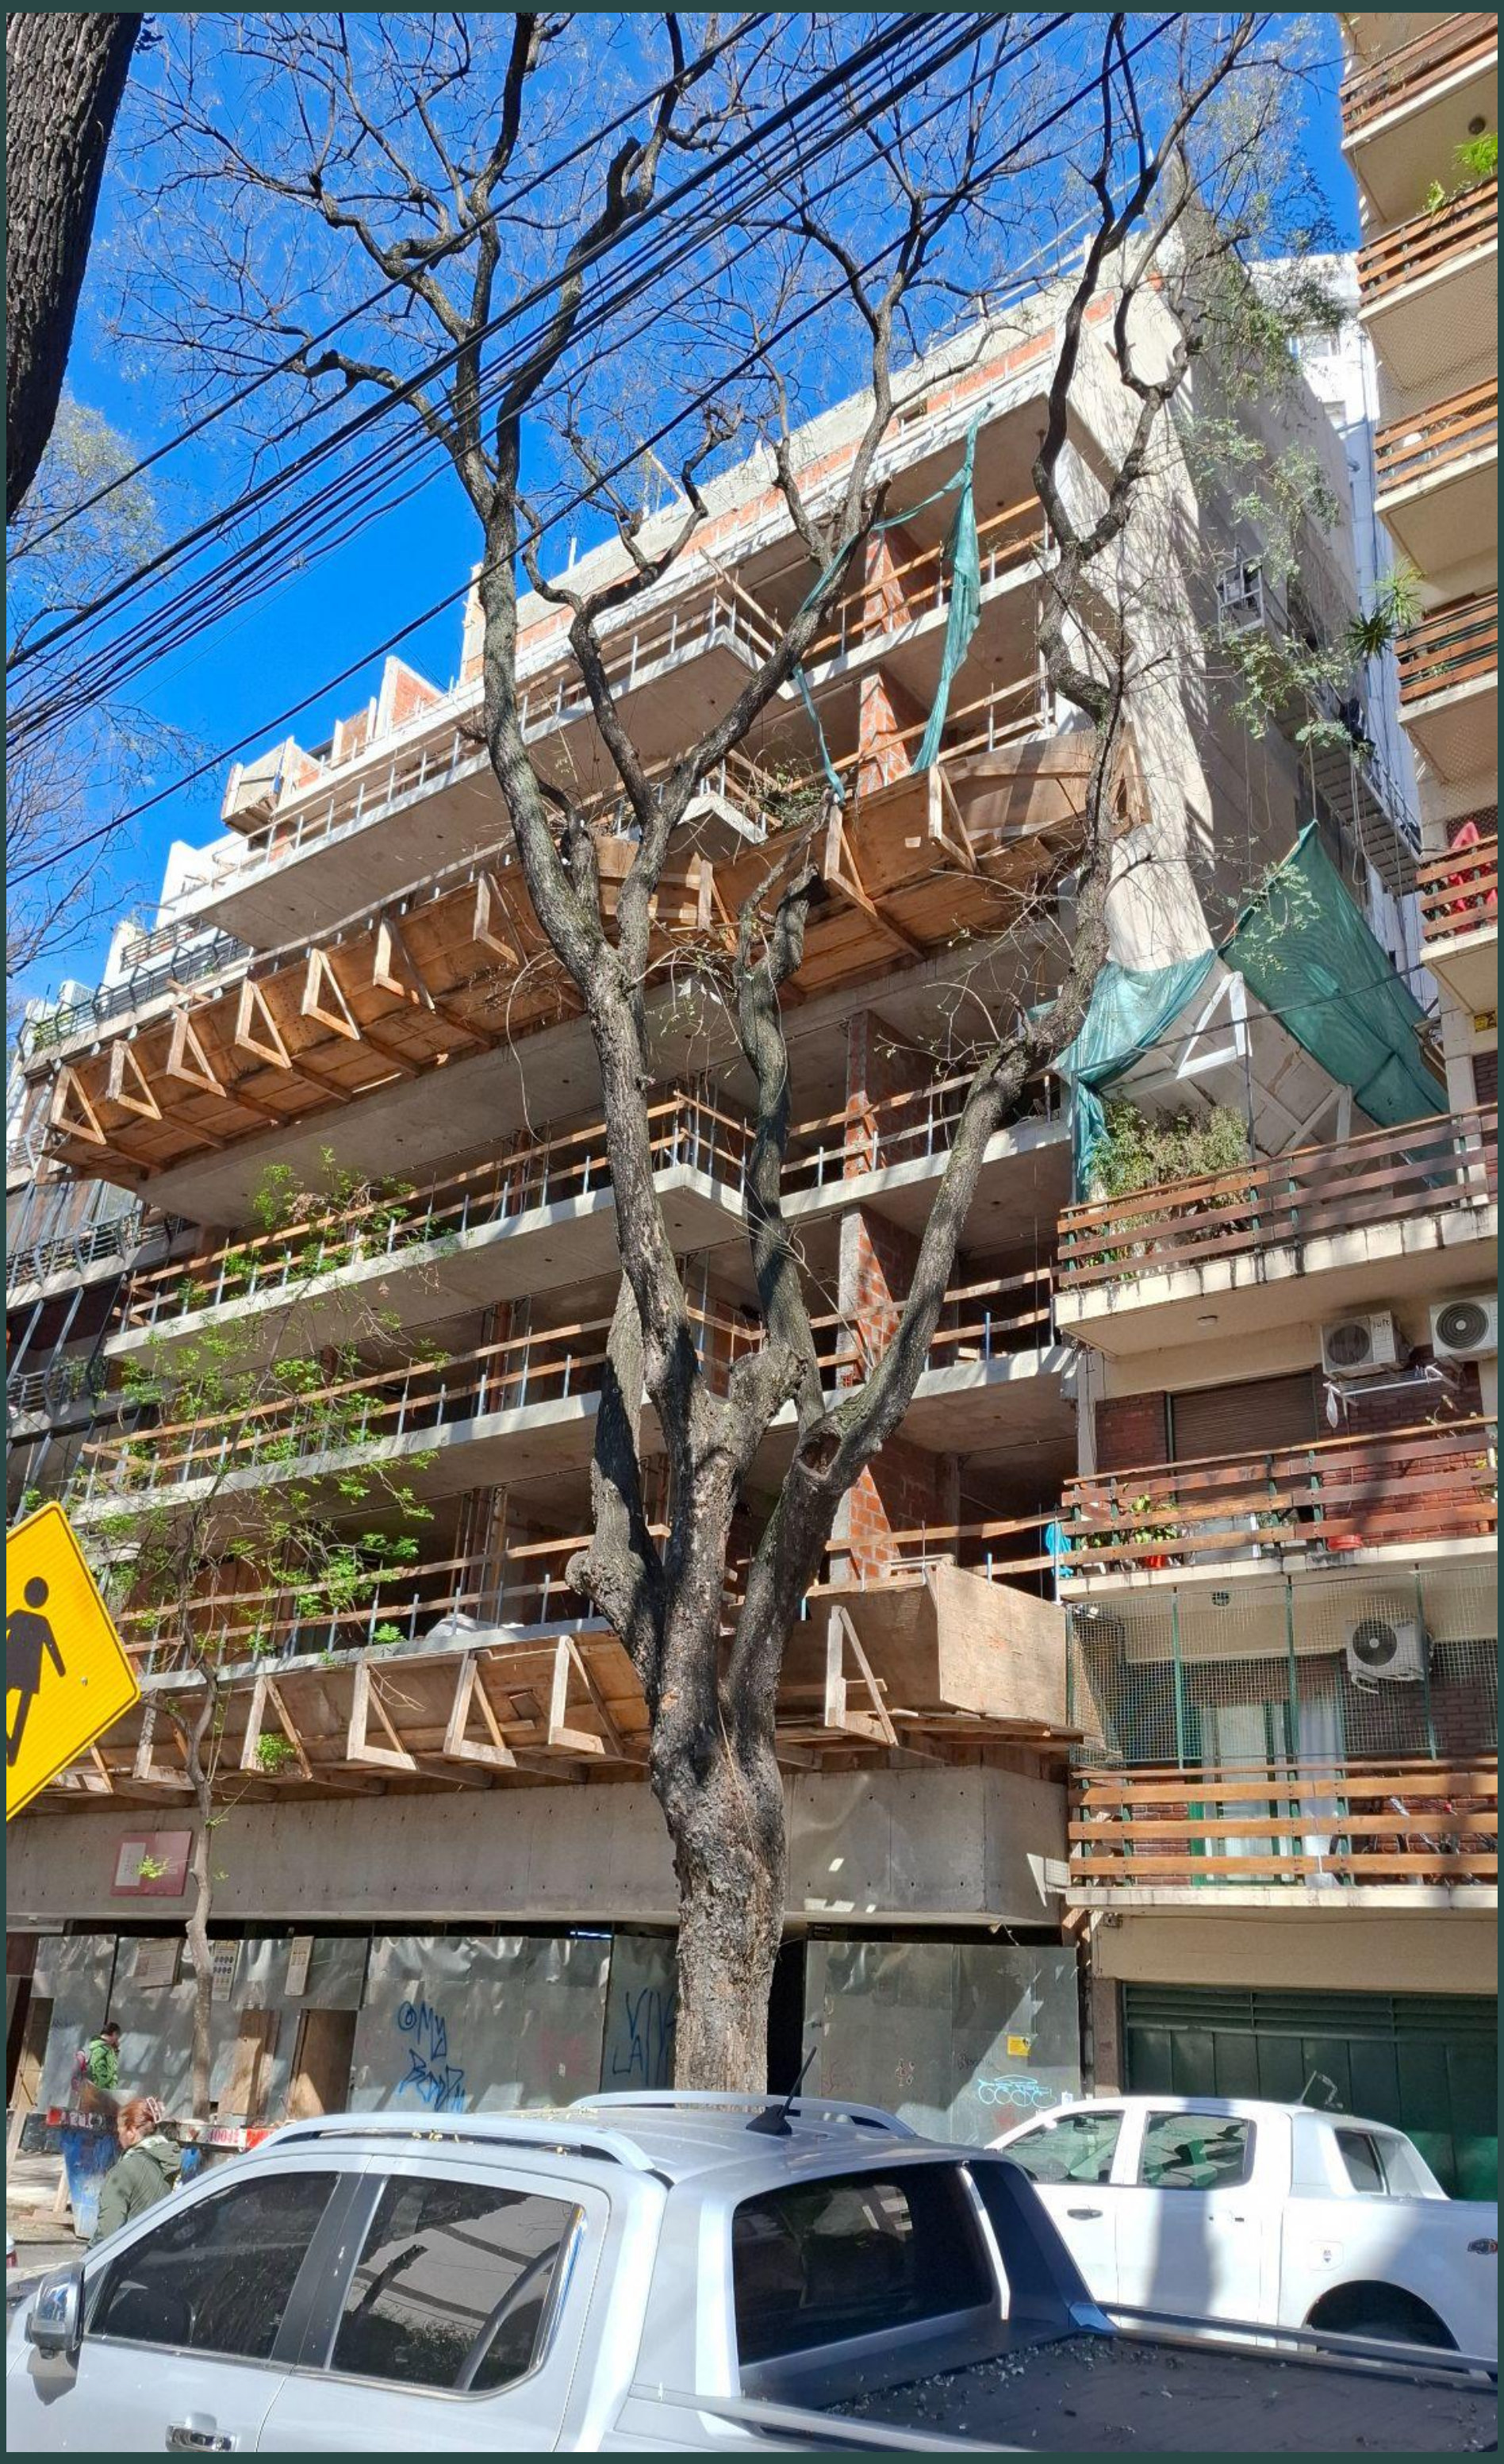


GRËVIA® DESARROLLOS SUSTENTABLES

En este proyecto participan:

Proyecta:

2PS PARYSOW + SCHARGRODSKY **ARQUITECTOS**

Dirección de obra:



Molinaro | Fenoglio arquitectos

Comercializa:

interwin

5275-4200

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail
info@grevia.com.ar

Teléfono
54 11 4804 4049
